PLANNING EXE 2 mis à jour reconsultation lot chauffage

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE 18 LOGEMENTS A SOUFFELWEYERSHEIM

SEDES

N°	Activités	Durée	Début	Fin
1	**PHASE PREPARATION**	**60 jours**	**Lun 30/01/23**	**Lun 24/04/23**
3	**PHASE EXE ETUDES**	**70 jours**	**Lun 30/01/23**	**Mar 09/05/23**
22	**PHASE 1 - BÂTIMENT 1**	**610 jours**	**Lun 08/08/22**	**Mar 25/02/25**
23	Test étanchéité à l'air intermédiaire après obtention HE / HA	1 jour	Mar 08/10/24	Mar 08/10/24
24	Obtention du rapport / transmission observations à lever	3 jours	Mer 09/10/24	Ven 11/10/24
25	Correction des désordres de l'enveloppe par les entreprises et contrôle des BET	2 sem.	Lun 14/10/24	Ven 25/10/24
26	02 / Terrassement - Aménagements extérieurs	431 jours	Lun 30/01/23	Lun 18/11/24
27	**Etudes**	**70 jours**	**Lun 30/01/23**	**Mar 09/05/23**
39	**Travaux préparatoires**	**48 jours**	**Mer 10/05/23**	**Mar 18/07/23**
40	Décapage terre végétale et préparation jardin avant démarrage GO	10 jours	Mer 10/05/23	Mer 24/05/23
41	Préparation des voiries pour circulations et base vie selon PIC lot 03	10 jours	Mar 27/06/23	Lun 10/07/23
42	Essais à plaques yc résultats	5 jours	Mar 11/07/23	Mar 18/07/23
43	**Voiries et aménagements extérieurs**	**72 jours**	**Jeu 25/07/24**	**Lun 18/11/24**
44	Pose des murêts en L	7 jours	Jeu 25/07/24	Lun 05/08/24
45	Préparation des voiries et aménagaments extérieurs	1 sem.	Lun 05/08/24	Ven 09/08/24
46	Engazonnements et plantations en période propices	10 jours	Lun 04/11/24	Lun 18/11/24
47	Mise en place des clôtures et aménagements de jardins	2 sem.	Lun 12/08/24	Jeu 05/09/24
48	Pavés et bordures	3 jours	Ven 06/09/24	Mar 10/09/24
49	Réalisation des enrobés	3 jours	Mer 11/09/24	Ven 13/09/24
50	03 / Gros-Œuvre	221 jours	Lun 30/01/23	Lun 08/01/24
51	Diffusion des EXE 1 finaux validés par BC	0 sem.	Ven 24/03/23	Ven 24/03/23
52	Listes fers fondations	5 jours	Lun 27/03/23	Ven 31/03/23
53	Listes de fer voiles et calepinage	5 jours	Lun 03/04/23	Ven 07/04/23
54	Listes fers dalles portées et calepinages	3 jours	Mar 11/04/23	Jeu 13/04/23
55	VISA MOE sur élements synthèse et dossier technique	10 jours	Lun 03/04/23	Lun 17/04/23
56	AVIS BC sur élements synthèse et dossier technique	10 jours	Mar 18/04/23	Mar 02/05/23
57	Adapation et validation dossier technique selon retour MOE et BC	5 jours	Mer 03/05/23	Mar 09/05/23
58	VISA MOA sur plans PAC définitifs et échantillons	5 jours	Mer 10/05/23	Mar 16/05/23
59	AVIS BC sur plans PAC définitifs	5 jours	Mer 17/05/23	Mar 24/05/23
60	BON POUR EXECUTION MOE ET BC + EXE 2 DE SYNTHESES TOUS LOTS YC RERSERVATION	0 jour	Mer 24/05/23	Mer 24/05/23
61	**Installation de chantier**	**121 jours**	**Lun 30/01/23**	**Ven 21/07/23**
62	Contact des concessionnaire pour obtention des raccordements nécessaires aux entreprises	10 sem.	Lun 30/01/23	Ven 07/04/23
63	Production du PIC	2 sem.	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23
64	Validation du PIC par la MOE et le CSPS	3 sem.	Lun 20/03/23	Ven 07/04/23
65	Installation panneau de chantier	5 jours	Mar 11/04/23	Lun 17/04/23
66	Installation base vie et clôtures de chantier	2 jours	Mer 19/07/23	Jeu 20/07/23
67	Contrôle Des installations par le CSPS / validation en Réunion de chantier	1 jour	Ven 21/07/23	Ven 21/07/23
68	**Terrassement et remblais**	**67 jours**	**Mer 19/07/23**	**Ven 03/11/23**
69	Implantation des bâtiments	1 jour	Mer 19/07/23	Mer 19/07/23
70	Décapage de la terre végétale	1 jour	Jeu 20/07/23	Jeu 20/07/23
71	Curage	1 jour	Ven 21/07/23	Ven 21/07/23
72	Nivellement du fond de fouille	1 jour	Ven 21/07/23	Ven 21/07/23
73	Préparation de la plateforme	1 jour	Lun 24/07/23	Lun 24/07/23
74	Remblais	4 jours	Lun 30/10/23	Ven 03/11/23
75	Traitement étanchéité des murs enterrés avant remblais en parallèle lot 07	2 jours	Jeu 26/10/23	Lun 30/10/23
76	**Fondations et soubassement**	**46 jours**	**Lun 21/08/23**	**Lun 23/10/23**
77	Terrassement des fondations	1 jour	Lun 21/08/23	Lun 21/08/23
78	Béton de propreté	1 jour	Mar 22/08/23	Mar 22/08/23
79	Ferraillage	1 jour	Mer 23/08/23	Mer 23/08/23
80	Bétonnage des fondations	1 jour	Jeu 24/08/23	Jeu 24/08/23
81	Arrêt de chantier réseaux sous dalle portée	15 jours	Mer 13/09/23	Mar 03/10/23
82	Réalisation du soubassement et dalle portée	1 sem.	Lun 09/10/23	Ven 13/10/23
83	**Dalle portée**	**6 jours**	**Lun 16/10/23**	**Lun 23/10/23**
89	**Voiles RDC**	**15 jours**	**Lun 16/10/23**	**Lun 06/11/23**
90	Coffrage voiles (yc pose huisseries métalliques)	4 jours	Lun 16/10/23	Jeu 19/10/23
91	Ferraillage voiles	5 jours	Ven 20/10/23	Jeu 26/10/23
92	Bétonnage voiles	5 jours	Ven 27/10/23	Ven 03/11/23
93	Poteaux	3 jours	Ven 27/10/23	Mar 31/10/23
94	Poutres	3 jours	Jeu 02/11/23	Lun 06/11/23
95	Remblais intérieurs	3 jours	Jeu 02/11/23	Lun 06/11/23
96	**Dalles RDC**	**87 jours**	**Mar 18/07/23**	**Jeu 30/11/23**
97	Commande prédalles	12 sem.	Mar 18/07/23	Mar 24/10/23
98	Coffrages et ferraillages	3 jours	Mar 24/10/23	Jeu 26/10/23
99	Dalles en béton armé épaisseur 20 cm	4 jours	Ven 27/10/23	Jeu 02/11/23
100	Séchage dalles	4 sem.	Ven 03/11/23	Jeu 30/11/23
101	**Voiles R+1**	**10 jours**	**Ven 03/11/23**	**Jeu 16/11/23**
102	Coffrage voiles (yc pose huisseries métalliques)	2 jours	Ven 03/11/23	Lun 06/11/23
103	Ferraillage voiles	4 jours	Mar 07/11/23	Ven 10/11/23
104	Bétonnage voiles	4 jours	Lun 13/11/23	Jeu 16/11/23
105	Poteaux	2 jours	Lun 13/11/23	Mar 14/11/23
106	Poutres	2 jours	Mer 15/11/23	Jeu 16/11/23
107	**Dalles R+1**	**87 jours**	**Jeu 24/08/23**	**Lun 08/01/24**
108	Commande prédalles	12 sem.	Jeu 24/08/23	Ven 17/11/23
109	Coffrages et ferraillages	3 jours	Ven 17/11/23	Mar 21/11/23
110	Dalles en béton armé épaisseur 20 cm	4 jours	Mer 22/11/23	Lun 27/11/23
111	Séchage dalles	4 sem.	Mar 28/11/23	Lun 08/01/24
112	**Voiles R+2**	**6 jours**	**Mar 28/11/23**	**Mar 05/12/23**
113	Coffrage voiles (yc pose huisseries métalliques)	2 jours	Mar 28/11/23	Mer 29/11/23
114	Ferraillage voiles	2 jours	Jeu 30/11/23	Ven 01/12/23
115	Bétonnage voiles	2 jours	Lun 04/12/23	Mar 05/12/23
116	Poteaux	1 jour	Lun 04/12/23	Lun 04/12/23
117	Poutres	1 jour	Mar 05/12/23	Mar 05/12/23
118	**Dalles R+2**	**74 jours**	**Mar 12/09/23**	**Lun 08/01/24**
119	Commande prédalles	12 sem.	Mar 12/09/23	Mer 06/12/23
120	Coffrages et ferraillages	2 jours	Mer 06/12/23	Jeu 07/12/23
121	Dalles en béton armé épaisseur 20 cm	3 jours	Ven 08/12/23	Mar 12/12/23
122	Séchage dalles	9 jours	Mer 13/12/23	Lun 08/01/24
123	04 / Etanchéité	289 jours	Mer 22/03/23	Ven 07/06/24
124	**Etudes**	**33 jours**	**Mer 22/03/23**	**Mar 09/05/23**
135	**Etanchéité Zone courantes**	**136 jours**	**Lun 13/11/23**	**Ven 07/06/24**
136	Commande des matériels étanchéité et zinguerie	8 sem.	Lun 13/11/23	Lun 22/01/24
137	Pare-vapeur	3 jours	Lun 22/01/24	Mer 24/01/24
138	Isolation thermique surface courante polyuréthane	3 jours	Jeu 25/01/24	Lun 29/01/24
139	Isolation thermique de relevés et acrotères laine de roche	2 jours	Mar 30/01/24	Mer 31/01/24
140	Etanchéité sur isolation thermique	3 jours	Jeu 01/02/24	Lun 05/02/24
141	Etanchéité sur dalles non isolées	1 sem.	Jeu 25/01/24	Mer 31/01/24
142	Etanchéité en relevés	3 jours	Mar 06/02/24	Jeu 08/02/24
143	Mise en eau de la toiture et contrôle	1 sem.	Ven 09/02/24	Jeu 15/02/24
144	Chemin de circulation et protection lourdes (gravillons et dalles sur plots)	5 jours	Ven 16/02/24	Jeu 22/02/24
145	Hors d'eau défintiif	0 jour	Ven 07/06/24	Ven 07/06/24
146	**Zinguerie**	**138 jours**	**Jeu 09/11/23**	**Ven 07/06/24**
147	Création sorties de toiture selon besoins des lots concernés	3 jours	Mer 17/01/24	Lun 22/01/24
148	Commande supports de panneaux solaires	8 sem.	Jeu 09/11/23	Jeu 18/01/24
149	Pose des supports de panneaux photovoltaiques selon besoins	2 jours	Jeu 18/01/24	Lun 22/01/24
150	Pose des lanternaux de désenfumage	3 jours	Lun 29/04/24	Jeu 02/05/24
151	Pose des couvertines selon détail D04	1 sem.	Lun 03/06/24	Ven 07/06/24
152	Percement EP et trop plein	3 jours	Jeu 25/01/24	Mar 30/01/24
153	05 / Menuiseries extérieures	360 jours	Mer 22/03/23	Lun 30/09/24
154	**Etudes**	**33 jours**	**Mer 22/03/23**	**Mar 09/05/23**
165	**Commandes et fabrications sur plans**	**8 sem.**	**Mar 19/03/24**	**Lun 20/05/24**
166	Hors D'air complet après pose des nouvelles menuiseries extérieures	0 jour	Jeu 30/05/24	Jeu 30/05/24
167	**Pose des menuiseries extérieures PVC**	**9 jours**	**Lun 20/05/24**	**Jeu 30/05/24**
168	RDC	3 jours	Lun 20/05/24	Mer 22/05/24
169	R+1	3 jours	Jeu 23/05/24	Lun 27/05/24
170	R+2	3 jours	Mar 28/05/24	Jeu 30/05/24
171	**Caissons de VR et BSO en aluminium**	**15 jours**	**Ven 31/05/24**	**Jeu 20/06/24**
172	RDC	5 jours	Ven 31/05/24	Jeu 06/06/24
173	R+1	5 jours	Ven 07/06/24	Jeu 13/06/24
174	R+2	5 jours	Ven 14/06/24	Jeu 20/06/24
175	Prise de mesures des BSO et tablettes de fenêtres	1 jour	Ven 05/07/24	Ven 05/07/24
176	Fabrication des BSO et tablettes de fenêtres	4 sem.	Lun 08/07/24	Ven 02/08/24
177	**Pose des BSO et tablettes**	**9 jours**	**Ven 06/09/24**	**Mer 18/09/24**
178	RDC	3 jours	Ven 06/09/24	Mar 10/09/24
179	R+1	3 jours	Mer 11/09/24	Ven 13/09/24
180	R+2	3 jours	Lun 16/09/24	Mer 18/09/24
181	Pose des ouvrants de désenfumages	3 jours	Mar 28/05/24	Jeu 30/05/24
182	Pose des portes vitrées extérieures neuves	10 jours	Lun 20/05/24	Ven 31/05/24
183	Pose des tablettes extérieures	2 sem.	Jeu 23/05/24	Mer 05/06/24
184	Pose des tablettes intérieures	5 jours	Lun 23/09/24	Lun 30/09/24
185	**Equipements et réglages**	**10 jours**	**Ven 06/09/24**	**Jeu 19/09/24**
186	Câblages en simultanée électricien	2 sem.	Ven 06/09/24	Jeu 19/09/24
187	06 / Serrurerie	272 jours	Lun 02/10/23	Mer 20/11/24
188	**Etudes**	**35 jours**	**Lun 13/11/23**	**Ven 12/01/24**
200	**Portes intérieures métalliques**	**232 jours**	**Lun 02/10/23**	**Lun 23/09/24**
201	Fourniture des huisseries à bancher au lot 03	2 sem.	Lun 02/10/23	Lun 16/10/23
202	Commande des portes à peindre	8 sem.	Mer 10/07/24	Mar 17/09/24
203	Pose des portes	5 jours	Mar 17/09/24	Lun 23/09/24
204	**Garde-corps acrotères et mains courante terrasse et escalier**	**3 jours**	**Lun 29/07/24**	**Mer 31/07/24**
205	Pose des garde-corps en toiture	3 jours	Lun 29/07/24	Mer 31/07/24
206	Pose des échelles à crinoline	2 jours	Jeu 01/08/24	Ven 02/08/24
207	Pose des grilles de ventilations	2 jours	Jeu 08/08/24	Lun 12/08/24
208	Pose des boîtes aux lettres	2 jours	Mar 19/11/24	Mer 20/11/24
209	07 / Isolation et peinture extérieure	356 jours	Lun 20/03/23	Jeu 19/09/24
210	**Etudes**	**35 jours**	**Lun 20/03/23**	**Mar 09/05/23**
222	**Isolation extérieure / peinture / crépis**	**201 jours**	**Lun 13/11/23**	**Jeu 19/09/24**

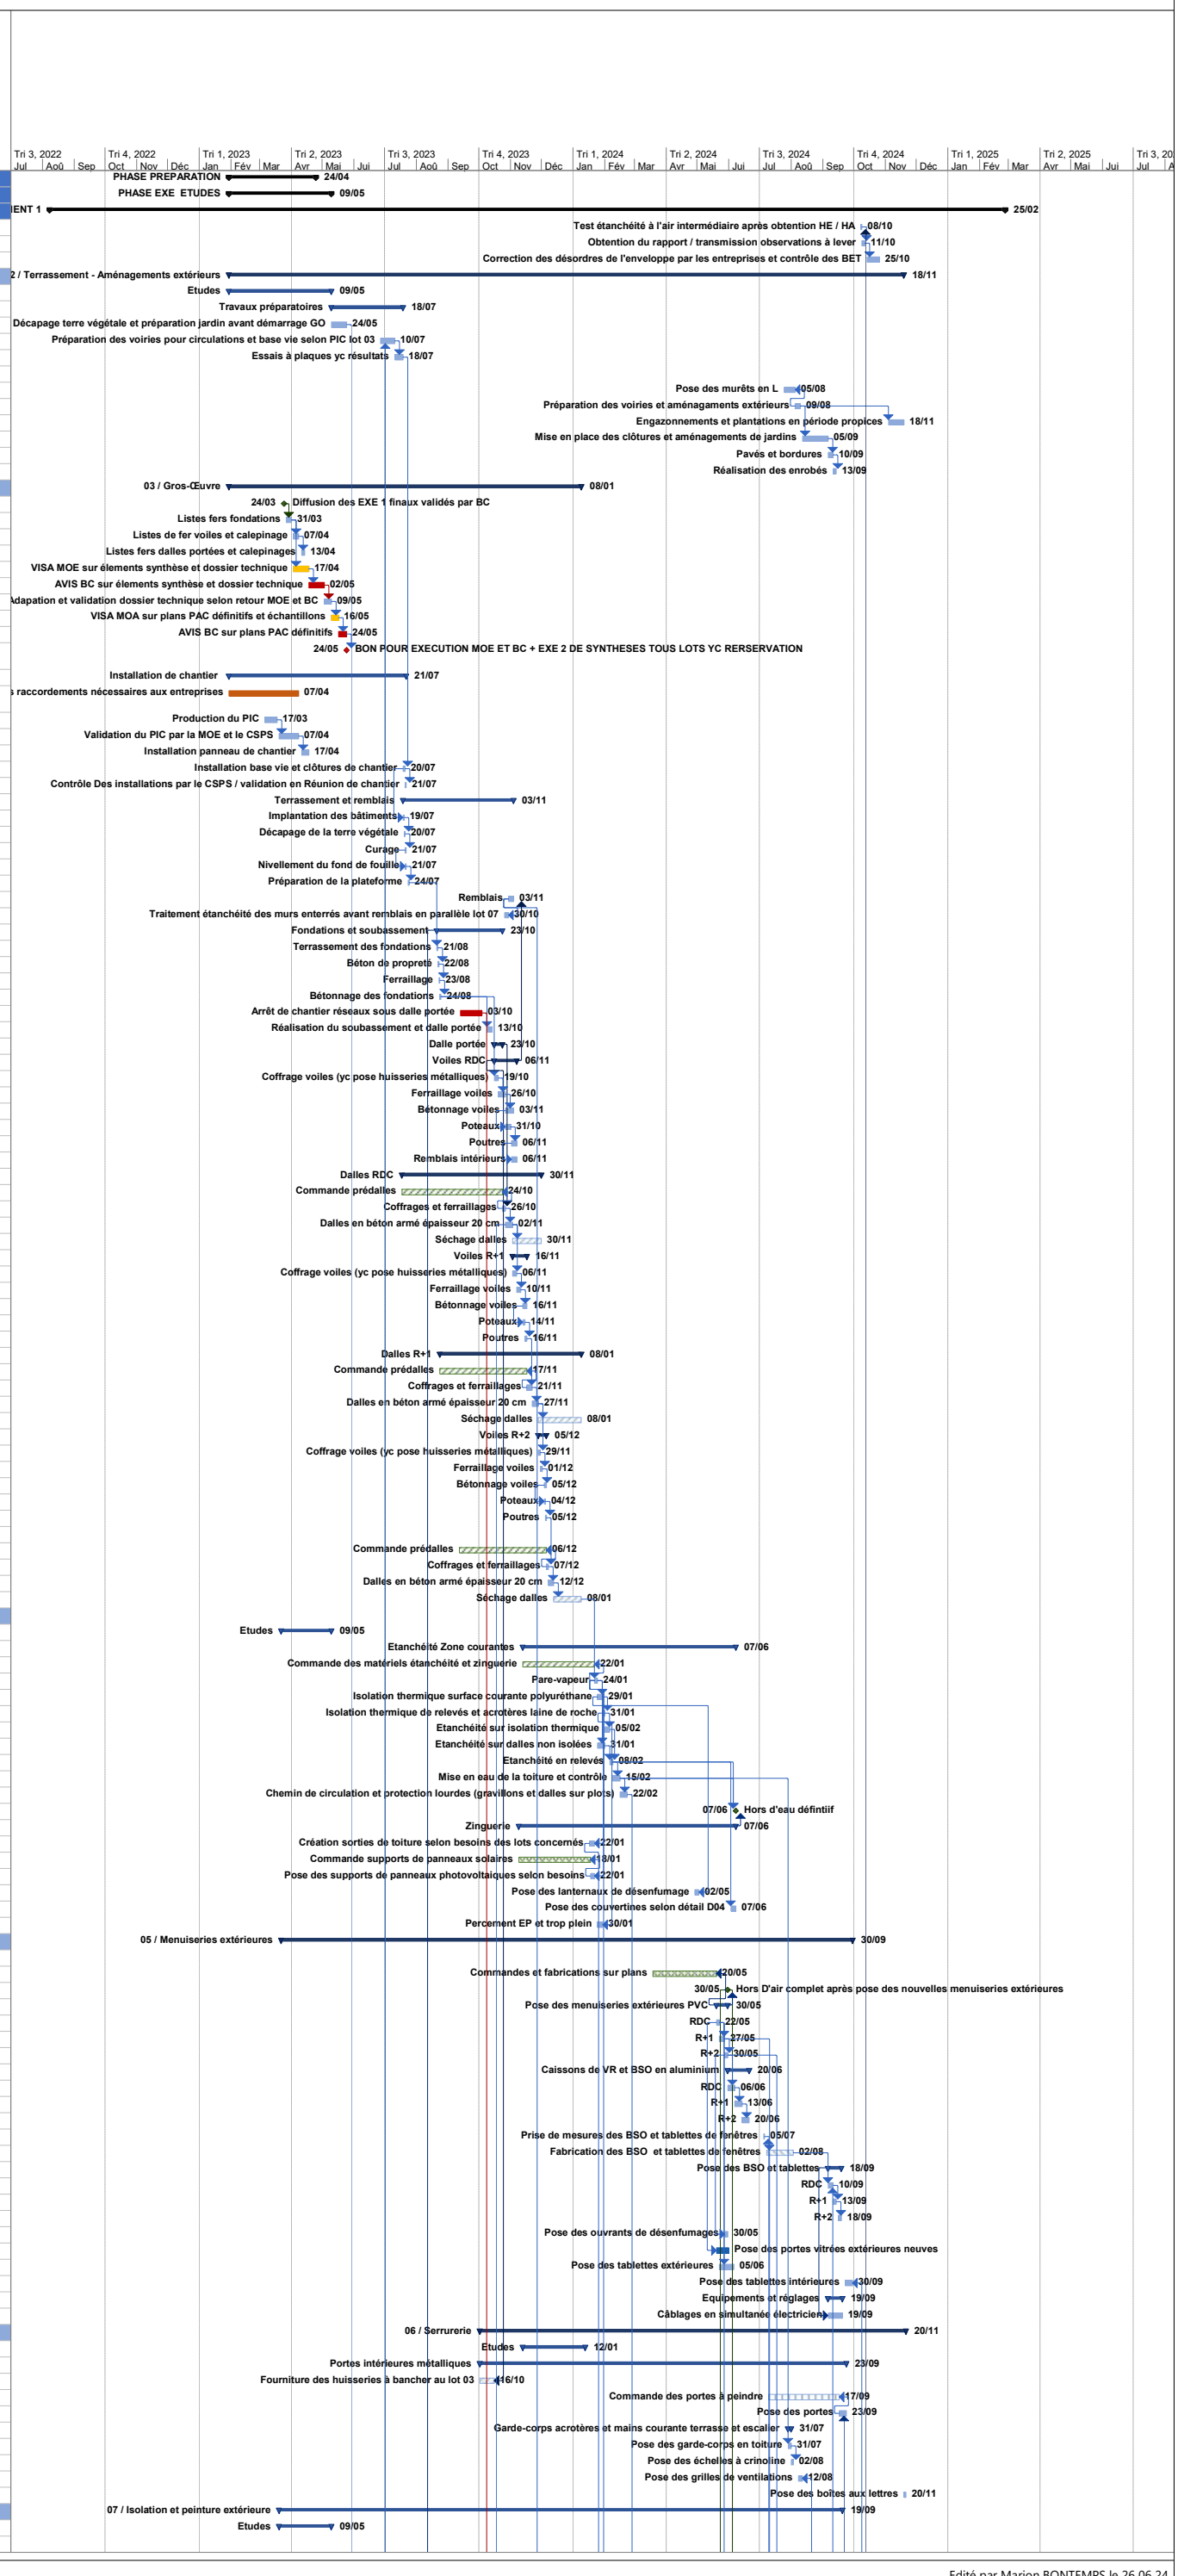

PLANNING EXE 2 mis à jour reconsultation lot chauffage

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE 18 LOGEMENTS A SOUFFELWEYERSHEIM

SEDES

N°	Activités	Durée	Début	Fin
223	Isolation thermique verticale enterrée des soubassements selon détail D09	5 jours	Lun 13/11/23	Ven 17/11/23
224	Préparation des supports	2 sem.	Mar 04/06/24	Lun 17/06/24
225	Profils de départs	3 jours	Mar 18/06/24	Jeu 20/06/24
226	Isolation extérieure (yc ébrasements fenêtres)	2 sem.	Ven 21/06/24	Jeu 04/07/24
227	Profilés en périphérie des menuiseries avec tôle en aluminium	1 sem.	Ven 05/07/24	Jeu 11/07/24
228	Crépis / Peinture / lasures extérieurs	2 sem.	Lun 12/08/24	Jeu 05/09/24
229	Sèchage crépis	2 sem.	Ven 06/09/24	Jeu 19/09/24
230	**Veture isolée**	**115 jours**	**Mar 26/03/24**	**Jeu 19/09/24**
231	Validation des échantillons vétures et crépis	10 jours	Mar 26/03/24	Jeu 11/04/24
232	Commande matériel véture	12 sem.	Jeu 11/04/24	Lun 08/07/24
233	Structure ossature bardage composite	2 sem.	Lun 08/07/24	Lun 22/07/24
234	Isolation derrière véture	2 sem.	Lun 22/07/24	Lun 05/08/24
235	Jonction entre crépis et bardage terre cuite selon détail D05	5 jours	Lun 05/08/24	Lun 12/08/24
236	Pose véture après crépis yc profils de finition	2 sem.	Ven 06/09/24	Jeu 19/09/24
237	08 / Echafaudages	287 jours	Lun 20/03/23	Lun 03/06/24
238	**Etudes**	**35 jours**	**Lun 20/03/23**	**Mar 09/05/23**
250	Installation des échafaudages de protections collectives	1 sem.	Lun 27/05/24	Ven 31/05/24
251	Contrôle des échafaudage par CSPS	1 jour	Lun 03/06/24	Lun 03/06/24
252	09/ Platrerie - faux plafonds	368 jours	Lun 20/03/23	Lun 07/10/24
253	**Etudes**	**306 jours**	**Lun 20/03/23**	**Lun 01/07/24**
266	**Pose des ossatures métalliques cloisons / gaines techniques**	**9 jours**	**Lun 01/07/24**	**Jeu 11/07/24**
267	RDC	3 jours	Lun 01/07/24	Mer 03/07/24
268	R+1	3 jours	Jeu 04/07/24	Lun 08/07/24
269	R+2	3 jours	Mar 09/07/24	Jeu 11/07/24
270	**Placo première peaux et doublages cloisons existantes**	**15 jours**	**Jeu 04/07/24**	**Mer 24/07/24**
271	RDC	5 jours	Jeu 04/07/24	Mer 10/07/24
272	R+1	5 jours	Jeu 11/07/24	Mer 17/07/24
273	R+2	5 jours	Jeu 18/07/24	Mer 24/07/24
274	**Fermeture des cloisons après passage fluides**	**13 jours**	**Jeu 29/08/24**	**Lun 16/09/24**
275	RDC	5 jours	Jeu 29/08/24	Mer 04/09/24
276	R+1	5 jours	Mer 04/09/24	Mar 10/09/24
277	R+2	5 jours	Mar 10/09/24	Lun 16/09/24
278	**Fermetures des gaines techniques après passages fluides (YC enduits)**	**10 jours**	**Mer 18/09/24**	**Mar 01/10/24**
279	RDC	2 jours	Mer 18/09/24	Jeu 19/09/24
280	R+1	2 jours	Mar 24/09/24	Mer 25/09/24
281	R+2	2 jours	Lun 30/09/24	Mar 01/10/24
282	**Fermetures des passages fluides cloisons après réception des bon à boucher**	**11 jours**	**Jeu 29/08/24**	**Jeu 12/09/24**
283	RDC	3 jours	Jeu 29/08/24	Lun 02/09/24
284	R+1	3 jours	Mer 04/09/24	Ven 06/09/24
285	R+2	3 jours	Mar 10/09/24	Jeu 12/09/24
286	**Pose de structures de plafonds fixes et soffites pour gaines techniques**	**12 jours**	**Jeu 05/09/24**	**Ven 20/09/24**
287	RDC	4 jours	Jeu 05/09/24	Mar 10/09/24
288	R+1	4 jours	Mer 11/09/24	Lun 16/09/24
289	R+2	4 jours	Mar 17/09/24	Ven 20/09/24
290	**Fermeture plafonds fixes et soffites (YC ENDUITS)**	**11 jours**	**Mer 18/09/24**	**Mer 02/10/24**
291	RDC	3 jours	Mer 18/09/24	Ven 20/09/24
292	R+1	3 jours	Mar 24/09/24	Jeu 26/09/24
293	R+2	3 jours	Lun 30/09/24	Mer 02/10/24
294	**Enduits de finitions avant peintures / Réception des supports avec lots concernés**	**11 jours**	**Lun 23/09/24**	**Lun 07/10/24**
295	RDC	3 jours	Lun 23/09/24	Mer 25/09/24
296	R+1	3 jours	Ven 27/09/24	Mar 01/10/24
297	R+2	3 jours	Jeu 03/10/24	Lun 07/10/24
298	10 / Menuiseries intérieures bois	419 jours	Lun 20/03/23	Jeu 19/12/24
299	**Etudes**	**35 jours**	**Lun 20/03/23**	**Mar 09/05/23**
311	Fabrication des portes	12 sem.	Mer 26/06/24	Mar 01/10/24
312	**Bloc-portes intérieurs des logements à peindre**	**9 jours**	**Mar 01/10/24**	**Lun 14/10/24**
313	RDC	3 jours	Mar 01/10/24	Ven 04/10/24
314	R+1	3 jours	Ven 04/10/24	Mer 09/10/24
315	R+2	3 jours	Mer 09/10/24	Lun 14/10/24
316	**Bloc-portes palières**	**12 jours**	**Lun 14/10/24**	**Mar 29/10/24**
317	RDC	3 jours	Lun 14/10/24	Mer 16/10/24
318	R+1	3 jours	Lun 21/10/24	Mer 23/10/24
319	R+2	2 jours	Lun 28/10/24	Mar 29/10/24
320	Trappes d'accès au GT	2 jours	Mer 02/10/24	Jeu 03/10/24
321	**Signalétique de sécurité**	**35 jours**	**Mer 30/10/24**	**Jeu 19/12/24**
322	Proposition du plans d'évacuation et plan d'intervention pompiers	20 jours	Mer 30/10/24	Jeu 28/11/24
323	Validation par les autorités compétentes	10 jours	Ven 29/11/24	Jeu 12/12/24
324	Pose de la signalétique	5 jours	Ven 13/12/24	Jeu 19/12/24
325	11 / Carrelage	382 jours	Lun 20/03/23	Ven 25/10/24
326	**Etudes**	**35 jours**	**Lun 20/03/23**	**Mar 09/05/23**
327	Diffusion des éléments de synthèse / dossier technique / note méthodologique OPC / PPSP	2 sem.	Lun 20/03/23	Ven 31/03/23
328	VISA MOE sur élements synthèse et dossier technique	10 jours	Lun 03/04/23	Lun 17/04/23
329	AVIS BC sur élements synthèse et dossier technique	10 jours	Mar 18/04/23	Mar 02/05/23
330	Adapation et validation dossier technique selon retour MOE et BC	5 jours	Mer 03/05/23	Mar 09/05/23
331	Fourniture plans PAC Version 1 et échantillons	2 sem.	Lun 27/03/23	Ven 07/04/23
332	VISA MOE sur plans PAC Version 1	10 jours	Mar 11/04/23	Lun 24/04/23
333	AVIS BC sur plans PAC Version 1	10 jours	Mar 11/04/23	Lun 24/04/23
334	Fourniture plans PAC Version 2	1 sem.	Mar 25/04/23	Mar 02/05/23
335	VISA MOE sur plans PAC définitifs et échantillons	5 jours	Mer 03/05/23	Mar 09/05/23
336	AVIS BC sur plans PAC définitifs	5 jours	Mer 03/05/23	Mar 09/05/23
337	BON POUR EXECUTION MOE ET BC + EXE 2	0 jour	Mar 09/05/23	Mar 09/05/23
338	COMMANDES DES CARREAUX	15 sem.	Mar 04/06/24	Lun 30/09/24
339	**Préparation des supports et Ragréages fibrés**	**10 jours**	**Jeu 26/09/24**	**Mer 09/10/24**
340	RDC	2 jours	Jeu 26/09/24	Ven 27/09/24
341	R+1	2 jours	Mer 02/10/24	Jeu 03/10/24
342	R+2	2 jours	Mar 08/10/24	Mer 09/10/24
343	**Pose des sols carrelages**	**15 jours**	**Lun 30/09/24**	**Ven 18/10/24**
344	RDC	5 jours	Lun 30/09/24	Ven 04/10/24
345	R+1	5 jours	Lun 07/10/24	Ven 11/10/24
346	R+2	5 jours	Lun 14/10/24	Ven 18/10/24
347	**Pose des plinthes et faïences**	**15 jours**	**Lun 07/10/24**	**Ven 25/10/24**
348	RDC	5 jours	Lun 07/10/24	Ven 11/10/24
349	R+1	5 jours	Lun 14/10/24	Ven 18/10/24
350	R+2	5 jours	Lun 21/10/24	Ven 25/10/24
351	12 / Sols souples	392 jours	Lun 20/03/23	Mar 12/11/24
352	**Etudes**	**35 jours**	**Lun 20/03/23**	**Mar 09/05/23**
364	COMMANDES DES SOLS SOUPLES	15 sem.	Jeu 20/06/24	Mer 16/10/24
365	**Préparation des supports et enduits de lissage / ragréages**	**12 jours**	**Lun 14/10/24**	**Mar 29/10/24**
366	RDC	2 jours	Lun 14/10/24	Mar 15/10/24
367	R+1	2 jours	Lun 21/10/24	Mar 22/10/24
368	R+2	2 jours	Lun 28/10/24	Mar 29/10/24
369	**Pose des sols PVC**	**15 jours**	**Mer 16/10/24**	**Mer 06/11/24**
370	RDC	5 jours	Mer 16/10/24	Mar 22/10/24
371	R+1	5 jours	Mer 23/10/24	Mar 29/10/24
372	R+2	5 jours	Mer 30/10/24	Mer 06/11/24
373	**Pose des plinthes**	**13 jours**	**Mer 23/10/24**	**Mar 12/11/24**
374	RDC	3 jours	Mer 23/10/24	Ven 25/10/24
375	R+1	3 jours	Mer 30/10/24	Lun 04/11/24
376	R+2	3 jours	Jeu 07/11/24	Mar 12/11/24
377	13 / Peintures intérieures	457 jours	Lun 20/03/23	Mar 25/02/25
378	**Etudes**	**45 jours**	**Lun 20/03/23**	**Mer 24/05/23**
390	Peinture des ouvrages en bois avant pose par menuisiers (trappe GT / tablettes)	1 sem.	Mer 25/09/24	Mer 02/10/24
391	Peinture des ouvrages en bois avant pose par menuisiers (portes)	1 sem.	Mar 24/09/24	Mar 01/10/24
392	COMMANDES DES PEINTURES	12 sem.	Mer 19/06/24	Mar 24/09/24
393	**Réceptions et Préparation des supports**	**15 jours**	**Lun 30/09/24**	**Ven 18/10/24**
394	RDC	5 jours	Lun 30/09/24	Ven 04/10/24
395	R+1	5 jours	Lun 07/10/24	Ven 11/10/24
396	R+2	5 jours	Lun 14/10/24	Ven 18/10/24
397	**Mise en peinture des murs et plafonds**	**15 jours**	**Lun 07/10/24**	**Ven 25/10/24**
398	RDC	5 jours	Lun 07/10/24	Ven 11/10/24
399	R+1	5 jours	Lun 14/10/24	Ven 18/10/24
400	R+2	5 jours	Lun 21/10/24	Ven 25/10/24
401	**Finitions après passage des autres corps de métiers ET PROTECTION**	**23 jours**	**Mar 29/10/24**	**Mar 03/12/24**
402	RDC	8 jours	Mar 29/10/24	Mar 12/11/24
403	R+1	8 jours	Mar 12/11/24	Ven 22/11/24
404	R+2	7 jours	Ven 22/11/24	Mar 03/12/24
405	**Peinture de sol après passage des autres corps d'état**	**6 jours**	**Jeu 09/01/25**	**Jeu 16/01/25**
406	Peinture sols RDC et paliers étage	3 jours	Jeu 09/01/25	Lun 13/01/25
407	Peinture sur escaliers (yc préparations)	3 jours	Mar 14/01/25	Jeu 16/01/25
408	Nettoyage essais et mises en services	3 jours	Mar 03/12/24	Ven 06/12/24
409	Peinture au pochoir pour signalétique	1 sem.	Ven 24/01/25	Jeu 30/01/25
410	Nettoyage avant réception	5 jours	Mer 19/02/25	Mar 25/02/25
411	15 / Chauffage	407 jours	Lun 27/03/23	Mar 10/12/24
412	Reconsultation lot chauffage	6 sem.	Lun 01/07/24	Ven 09/08/24
413	**Etudes**	**40 jours**	**Lun 27/03/23**	**Mer 24/05/23**
425	Préparation des alimentations nécessaires aux autres lots	2 sem.	Ven 09/02/24	Ven 23/02/24
426	Commande chaudière gaz	15 sem.	Jeu 26/10/23	Ven 23/02/24
427	Installation chaudière gaz	1 sem.	Ven 23/02/24	Jeu 29/02/24
428	**Distributions en cloisons / mise en attente pour circulations en plafonds**	**12 jours**	**Lun 12/08/24**	**Lun 09/09/24**
429	RDC	4 jours	Lun 12/08/24	Mer 28/08/24
430	R+1	4 jours	Jeu 29/08/24	Mar 03/09/24
431	R+2	4 jours	Mer 04/09/24	Lun 09/09/24
432	**Réseaux et calorifuges**	**15 jours**	**Mer 25/09/24**	**Mar 15/10/24**
433	Calorifuges RDC	5 jours	Mer 25/09/24	Mar 01/10/24
434	Calorifuges R+1	5 jours	Mer 02/10/24	Mar 08/10/24
435	Calorifuges R+2	5 jours	Mer 09/10/24	Mar 15/10/24

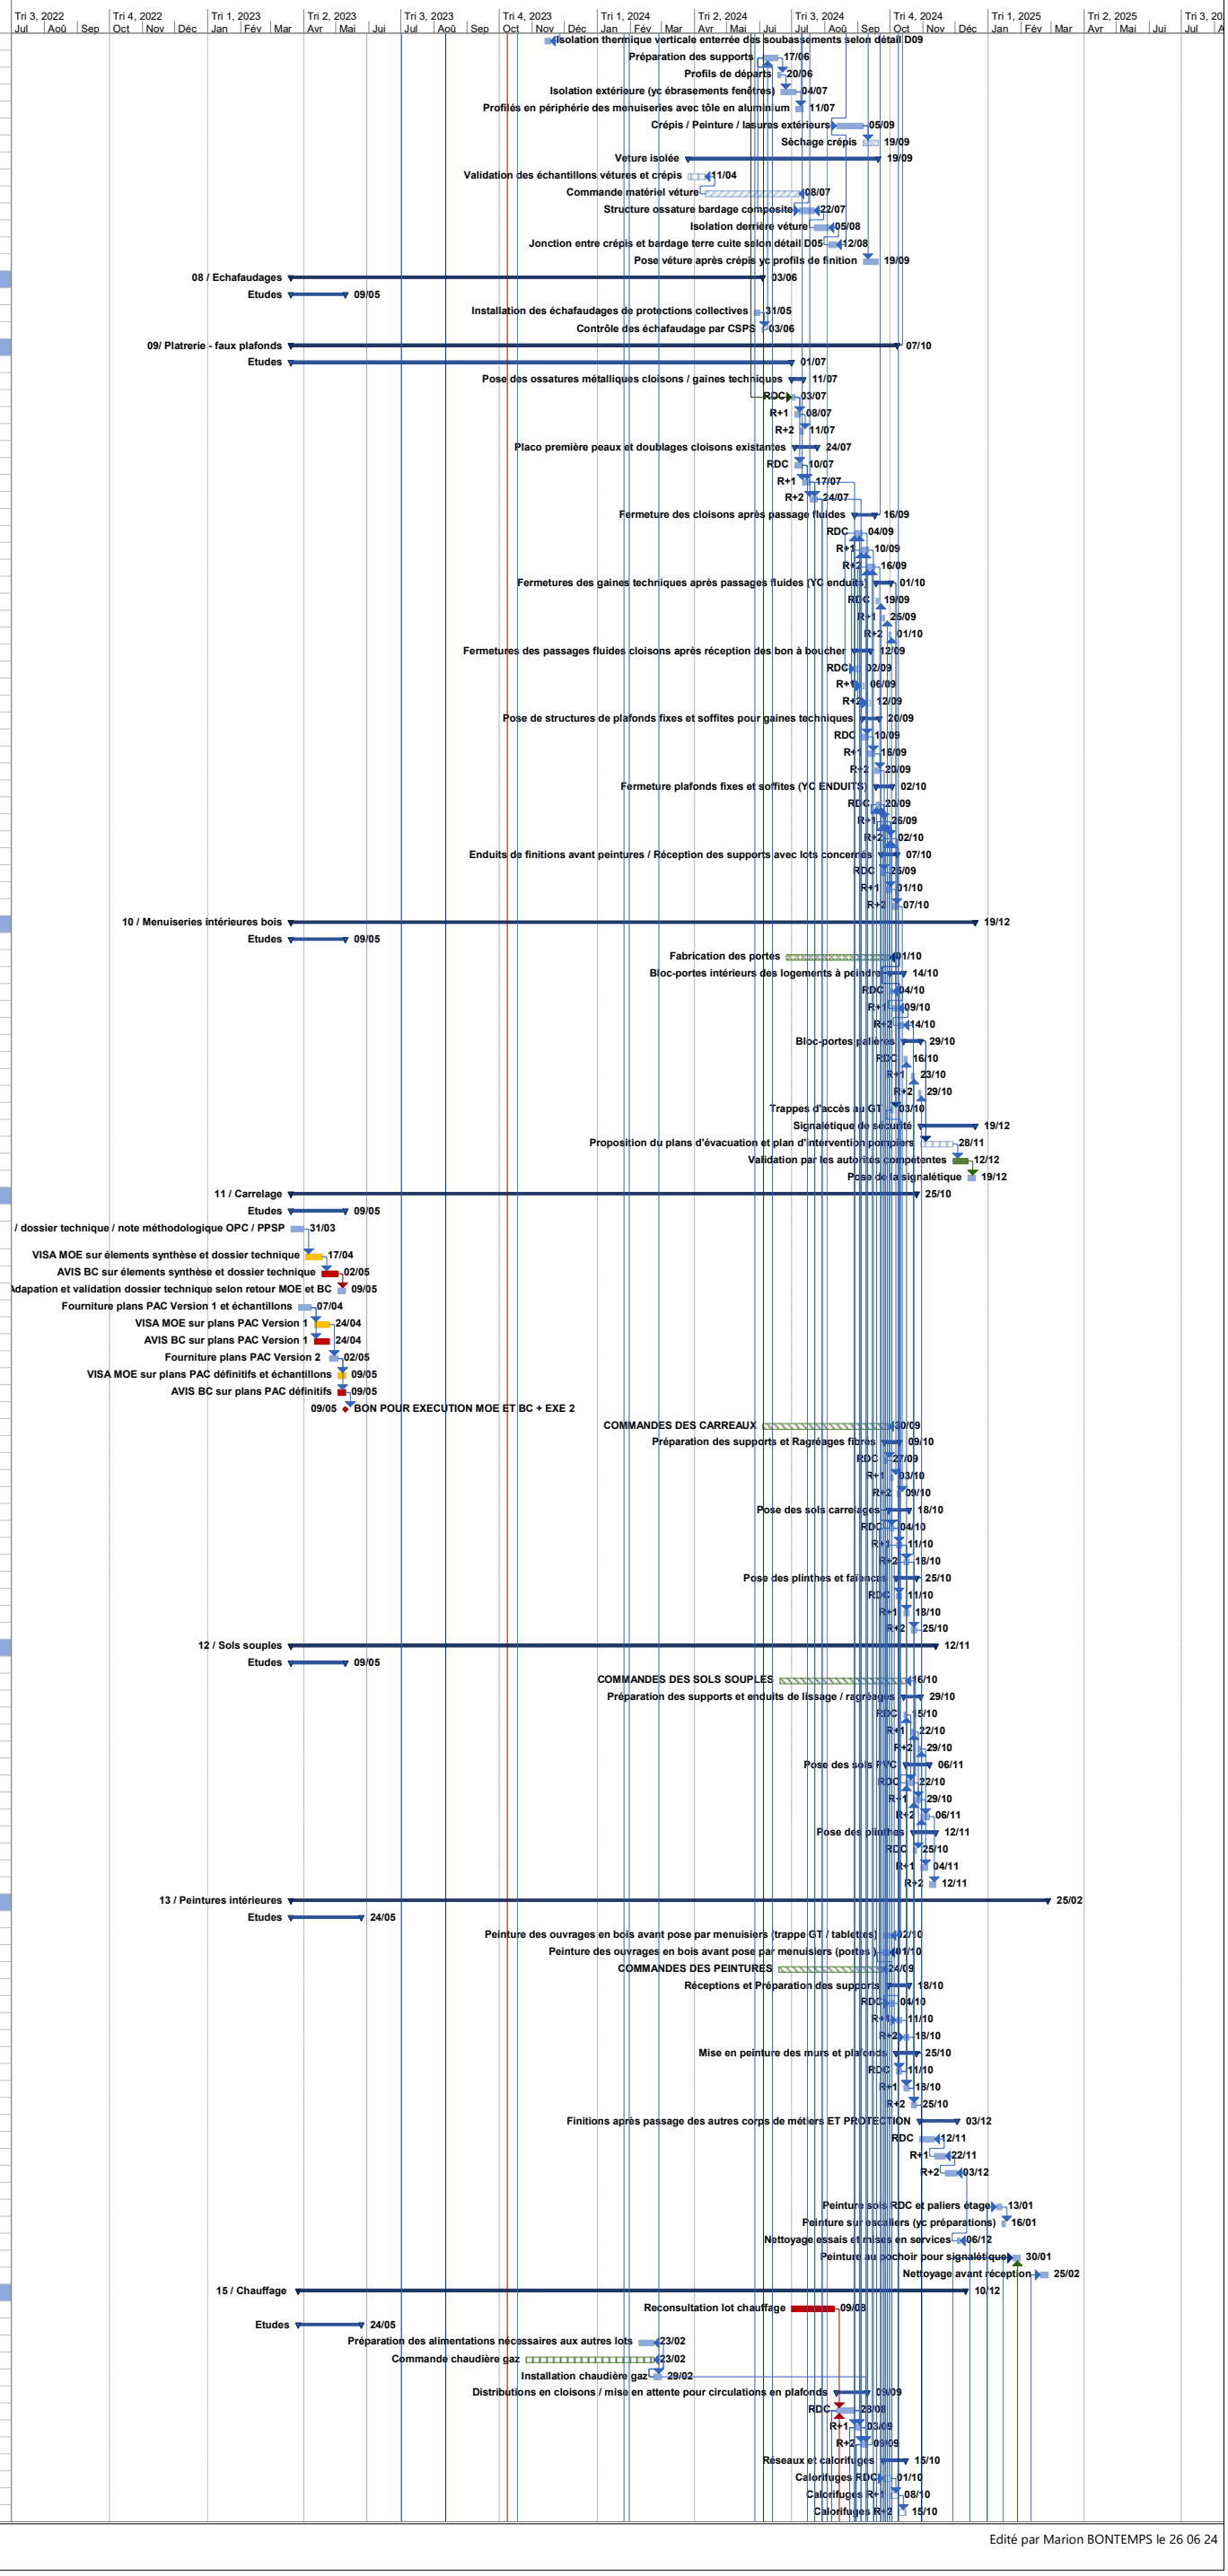

PLANNING EXE 2 mis à jour reconsultation lot chauffage

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE 18 LOGEMENTS A SOUFFELWEYERSHEIM

SEDES

N°	Activités	Durée	Début	Fin
436	**Distributions chauffage en plafonds**	**13 jours**	**Mer 11/09/24**	**Ven 27/09/24**
437	RDC	5 jours	Mer 11/09/24	Mar 17/09/24
438	R+1	5 jours	Mar 17/09/24	Lun 23/09/24
439	R+2	5 jours	Lun 23/09/24	Ven 27/09/24
440	**Divers**	**90 jours**	**Mar 23/07/24**	**Mar 10/12/24**
441	Travaux chaudière gaz	1 sem.	Lun 30/09/24	Ven 04/10/24
442	COMMANDE APPAREILLAGES	12 sem.	Mar 23/07/24	Lun 28/10/24
443	Pose des équipements et appareillages	1 sem.	Lun 28/10/24	Lun 04/11/24
444	Régulation - GTB	5 jours	Mer 13/11/24	Mar 19/11/24
445	Pré-essais et mises en service	1 sem.	Mer 20/11/24	Mar 26/11/24
446	Vérification par BET fluides / Bureau de contrôle et correctifs éventuels	2 sem.	Mer 27/11/24	Mar 10/12/24
447	16 / Ventilation	560 jours	Lun 08/08/22	Mar 03/12/24
448	**Etudes**	**35 jours**	**Lun 27/03/23**	**Mar 16/05/23**
460	**Travaux**	**560 jours**	**Lun 08/08/22**	**Mar 03/12/24**
461	Dimensionnement et commande des entrées d'air	4 sem.	Lun 08/08/22	Lun 05/09/22
462	Fourniture des entrées d'airs au lot 05	1 jour	Lun 05/09/22	Lun 05/09/22
463	**Distributions simple flux en plafonds / GT yc rebouchages**	**171 jours**	**Mar 16/01/24**	**Lun 30/09/24**
464	RDC	1 sem.	Mer 11/09/24	Mer 18/09/24
465	R+1	1 sem.	Mar 17/09/24	Mar 24/09/24
466	R+2	1 sem.	Lun 23/09/24	Lun 30/09/24
467	Fourniture chapeau toiture au lot 04	1 jour	Mar 16/01/24	Mer 17/01/24
468	Pose des grilles en façade locaux avant isolation extérieure	3 jours	Jeu 30/05/24	Mar 04/06/24
469	Commande VMC commune	15 sem.	Mar 04/06/24	Lun 30/09/24
470	Installation VMC	1 sem.	Lun 30/09/24	Ven 04/10/24
471	Pose des registres et collecteurs intermédiaires	5 jours	Lun 07/10/24	Ven 11/10/24
472	COMMANDE APPAREILLAGES	12 sem.	Mar 23/07/24	Lun 28/10/24
473	Pose des bouches d'extraction	2 jours	Lun 28/10/24	Mar 29/10/24
474	Test étanchéité réseau	2 jours	Ven 08/11/24	Mer 13/11/24
475	Pré-essais et mises en service	1 sem.	Mer 13/11/24	Mar 19/11/24
476	Vérification par BET fluides / Bureau de contrôle et correctifs éventuels	2 sem.	Mer 20/11/24	Mar 03/12/24
477	17 / Assainissement plomberie sanitaire	407 jours	Lun 27/03/23	Mar 10/12/24
478	**Etudes**	**40 jours**	**Lun 27/03/23**	**Mer 24/05/23**
490	Mise en place des réseaux en avant du chantier / repiquage sur les existants	15 jours	Jeu 25/05/23	Mer 14/06/23
491	Pose station relavage et séparateur hydrocarbure	5 jours	Jeu 15/06/23	Mer 21/06/23
492	Validation par autorités compétentes avant fermeture des fouilles	3 jours	Jeu 22/06/23	Lun 26/06/23
493	Mise en place des caniveaux et ajustements des regards en simultanée aménagements extérieurs	5 jours	Mar 27/06/23	Lun 03/07/23
494	Mise en place des réseaux sous dalle portée en parallèle lot GO	5 jours	Mer 04/10/23	Mar 10/10/23
495	**Production EAU ET ECS**	**224 jours**	**Ven 27/10/23**	**Mar 08/10/24**
496	Incorporations en dalles selon avancement du GO / attentes siphons	1 mois	Ven 27/10/23	Ven 24/11/23
497	Robinets de puisages avant crépis	4 jours	Mer 29/05/24	Mar 04/06/24
498	Mise en place des conduites à l'avancement des cloisons (EP/EU/EV)	15 jours	Lun 12/08/24	Jeu 12/09/24
499	R+2	5 jours	Lun 12/08/24	Jeu 29/08/24
500	R+1	5 jours	Ven 30/08/24	Jeu 05/09/24
501	RDC	5 jours	Ven 06/09/24	Jeu 12/09/24
502	Mise en place des conduites à l'avancement des PLAFONDS (EP/EU/EV)	15 jours	Mer 11/09/24	Mar 01/10/24
503	R+2	5 jours	Mer 11/09/24	Mar 17/09/24
504	R+1	5 jours	Mer 18/09/24	Mar 24/09/24
505	RDC	5 jours	Mer 25/09/24	Mar 01/10/24
506	Calorifuges	2 sem.	Mer 25/09/24	Mar 08/10/24
507	**Appareils sanitaires**	**93 jours**	**Mar 18/06/24**	**Jeu 07/11/24**
508	Commande des appareils sanitaires	12 sem.	Mar 18/06/24	Lun 23/09/24
509	Pose des baignoires avant carrelage	5 jours	Lun 23/09/24	Lun 30/09/24
510	Pose des WC	3 jours	Lun 28/10/24	Mer 30/10/24
511	Pose plans vasque, meuble éviers	5 jours	Jeu 31/10/24	Jeu 07/11/24
512	**Divers**	**43 jours**	**Mer 09/10/24**	**Mar 10/12/24**
513	Travaux locaux techniques	2 sem.	Mer 09/10/24	Mar 22/10/24
514	Etiquetage des réseaux	5 jours	Mer 23/10/24	Mar 29/10/24
515	Pré-essais et mises en service	2 sem.	Mer 13/11/24	Mar 26/11/24
516	Vérification par BET fluides / Bureau de contrôle et correctifs éventuels	2 sem.	Mer 27/11/24	Mar 10/12/24
517	18 / Electricité notifié le 25/09/23	296 jours	Lun 21/08/23	Mar 12/11/24
518	**Etudes**	**37 jours**	**Lun 02/10/23**	**Mer 22/11/23**
519	Diffusion des éléments de synthèse / dossier technique / note méthodologique OPC / PPSP	2 sem.	Lun 02/10/23	Ven 13/10/23
520	VISA MOE sur élements synthèse et dossier technique	10 jours	Lun 16/10/23	Ven 27/10/23
521	AVIS BC sur élements synthèse et dossier technique	10 jours	Lun 30/10/23	Lun 13/11/23
522	Adapation et validation dossier technique selon retour MOE et BC	7 jours	Mar 14/11/23	Mer 22/11/23
523	Fourniture plans PAC Version 1 et besoins en réservations	2 sem.	Jeu 12/10/23	Mer 25/10/23
524	VISA MOE sur plans PAC Version 1	10 jours	Jeu 12/10/23	Mer 25/10/23
525	AVIS BC sur plans PAC Version 1	10 jours	Jeu 12/10/23	Mer 25/10/23
526	Fourniture plans PAC Version 2	1 sem.	Jeu 26/10/23	Jeu 02/11/23
527	VISA MOE sur plans PAC définitifs	4 jours	Ven 03/11/23	Mer 08/11/23
528	AVIS BC sur plans PAC définitifs	4 jours	Ven 03/11/23	Mer 08/11/23
529	BON POUR EXECUTION MOE ET BC	0 jour	Mer 08/11/23	Mer 08/11/23
530	Préparation des alimentations nécessaires aux autres lots	2 sem.	Ven 17/05/24	Ven 31/05/24
531	Incorporations en parallèle lots GO / mise à la terre	3 mois	Lun 21/08/23	Lun 13/11/23
532	**Avance sur distributions / interventions sur équipements existants**	**15 jours**	**Ven 31/05/24**	**Jeu 20/06/24**
533	Chemins de câbles RDC	5 jours	Ven 31/05/24	Jeu 06/06/24
534	Chemins de câbles R+1	5 jours	Ven 07/06/24	Jeu 13/06/24
535	Chemins de câbles R+2	5 jours	Ven 14/06/24	Jeu 20/06/24
536	**Distributions en cloisons / mise en attente pour circulations en plafonds**	**15 jours**	**Jeu 11/07/24**	**Mer 31/07/24**
537	RDC	5 jours	Jeu 11/07/24	Mer 17/07/24
538	R+1	5 jours	Jeu 18/07/24	Mer 24/07/24
539	R+2	5 jours	Jeu 25/07/24	Mer 31/07/24
540	**Distributions électriques (yc rebouchages à l'avancement / traitement CF)**	**13 jours**	**Mer 11/09/24**	**Ven 27/09/24**
541	Câblage RDC	5 jours	Mer 11/09/24	Mar 17/09/24
542	Câblage R+1	5 jours	Mar 17/09/24	Lun 23/09/24
543	Câblage R+2	5 jours	Lun 23/09/24	Ven 27/09/24
544	**Tableaux divisionnaires**	**15 jours**	**Lun 30/09/24**	**Ven 18/10/24**
545	Cablâges et tableaux RDC	5 jours	Lun 30/09/24	Ven 04/10/24
546	Cablâges et tableaux R+1	5 jours	Lun 07/10/24	Ven 11/10/24
547	Cablâges et tableaux R+2	5 jours	Lun 14/10/24	Ven 18/10/24
548	TGBT équipements et étiquettage	3 jours	Lun 21/10/24	Mer 23/10/24
549	COMMANDE APPAREILLAGES	12 sem.	Mar 23/07/24	Lun 28/10/24
550	Pose des équipements et appareillages	2 sem.	Lun 28/10/24	Mar 12/11/24
551	19 / Photovoltaïque	412 jours	Lun 06/02/23	Lun 28/10/24
552	**Etudes**	**65 jours**	**Lun 06/02/23**	**Mar 09/05/23**
553	Diffusion des éléments de synthèse / dossier technique / note méthodologique OPC / PPSP	2 sem.	Lun 06/02/23	Ven 17/02/23
554	VISA MOE sur élements synthèse et dossier technique	10 jours	Lun 20/02/23	Ven 03/03/23
555	AVIS BC sur élements synthèse et dossier technique	10 jours	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23
556	Adapation et validation dossier technique selon retour MOE et BC	5 jours	Lun 20/03/23	Ven 24/03/23
557	Fourniture plans PAC Version 1	2 sem.	Lun 27/03/23	Ven 07/04/23
558	VISA MOE sur plans PAC Version 1	10 jours	Mar 11/04/23	Lun 24/04/23
559	AVIS BC sur plans PAC Version 1	10 jours	Mar 11/04/23	Lun 24/04/23
560	Fourniture plans PAC Version 2	1 sem.	Mar 25/04/23	Mar 02/05/23
561	VISA MOE sur plans PAC définitifs	5 jours	Mer 03/05/23	Mar 09/05/23
562	AVIS BC sur plans PAC définitifs	5 jours	Mer 03/05/23	Mar 09/05/23
563	BON POUR EXECUTION MOE ET BC	0 jour	Mar 09/05/23	Mar 09/05/23
564	**Distributions Verticales**	**13 jours**	**Jeu 11/07/24**	**Lun 29/07/24**
565	RDC	3 jours	Jeu 11/07/24	Lun 15/07/24
566	R+1	3 jours	Jeu 18/07/24	Lun 22/07/24
567	R+2	3 jours	Jeu 25/07/24	Lun 29/07/24
568	**Distributions horizontales**	**11 jours**	**Mer 11/09/24**	**Mer 25/09/24**
569	Câblage RDC	3 jours	Mer 11/09/24	Ven 13/09/24
570	Câblage R+1	3 jours	Mar 17/09/24	Jeu 19/09/24
571	Câblage R+2	3 jours	Lun 23/09/24	Mer 25/09/24
572	Commandes des panneaux solaires et équipements	12 sem.	Mar 23/07/24	Lun 28/10/24
573	Pose des supports de panneaux solaires en parallèle étanchéité	1 sem.	Lun 15/01/24	Lun 22/01/24
574	Installation des onduleurs	3 jours	Ven 11/10/24	Mer 16/10/24
575	Pose du TGS	3 jours	Mer 16/10/24	Lun 21/10/24
576	Pose des panneaux solaires	1 sem.	Jeu 26/09/24	Mer 02/10/24
577	PHASE 2 - BATIMENT 2	590 jours	Lun 05/09/22	Mar 25/02/25
578	Test étanchéité à l'air intermédiaire après obtention HE / HA	1 jour	Mer 26/06/24	Mer 26/06/24
579	Obtention du rapport / transmission observations à lever	3 jours	Jeu 27/06/24	Lun 01/07/24
580	Correction des désordres de l'enveloppe par les entreprises et contrôle des BET	2 sem.	Mar 02/07/24	Lun 15/07/24
581	Test étanchéité à l'air final avant réception	1 jour	Ven 24/01/25	Ven 24/01/25
582	Obtention du rapport / transmission observations à lever	5 jours	Lun 27/01/25	Ven 31/01/25
583	Correction des désordres de rebouchages par les entreprises et contrôle des BET	1 sem.	Lun 03/02/25	Ven 07/02/25
584	03 / Gros-Œuvre	110 jours	Mar 07/11/23	Mer 24/04/24
635	04 / Etanchéité	66 jours	Mar 27/02/24	Lun 03/06/24
636	**Etanchéité Zone courantes**	**64 jours**	**Jeu 29/02/24**	**Lun 03/06/24**
637	Commande des matériels étanchéité et zinguerie	8 sem.	Jeu 29/02/24	Lun 29/04/24
638	Pare-vapeur	3 jours	Lun 29/04/24	Jeu 02/05/24
639	Isolation thermique surface courante polyuréthane	3 jours	Ven 03/05/24	Mar 07/05/24
640	Isolation thermique de relevés et acrotères laine de roche	2 jours	Mer 08/05/24	Ven 10/05/24
641	Etanchéité sur isolation thermique	3 jours	Lun 13/05/24	Mer 15/05/24
642	Etanchéité sur dalles non isolées	1 sem.	Ven 03/05/24	Ven 10/05/24
643	Etanchéité en relevés	3 jours	Jeu 16/05/24	Lun 20/05/24
644	Mise en eau de la toiture et contrôle	1 sem.	Mar 21/05/24	Lun 27/05/24
645	Chemin de circulation et protection lourdes (gravillons et dalles sur plots)	5 jours	Mar 28/05/24	Lun 03/06/24
646	Hors d'eau défintiif	0 jour	Lun 27/05/24	Lun 27/05/24
647	**Zinguerie**	**61 jours**	**Mar 27/02/24**	**Lun 27/05/24**
648	Création sorties de toiture selon besoins des lots concernés	3 jours	Mer 24/04/24	Lun 29/04/24
649	Commande supports de panneaux solaires	8 sem.	Mar 27/02/24	Jeu 25/04/24
650	Pose des supports de panneaux photovoltaiques selon besoins	2 jours	Jeu 25/04/24	Lun 29/04/24
651	Pose des lanternaux de désenfumage	3 jours	Lun 29/04/24	Ven 03/05/24

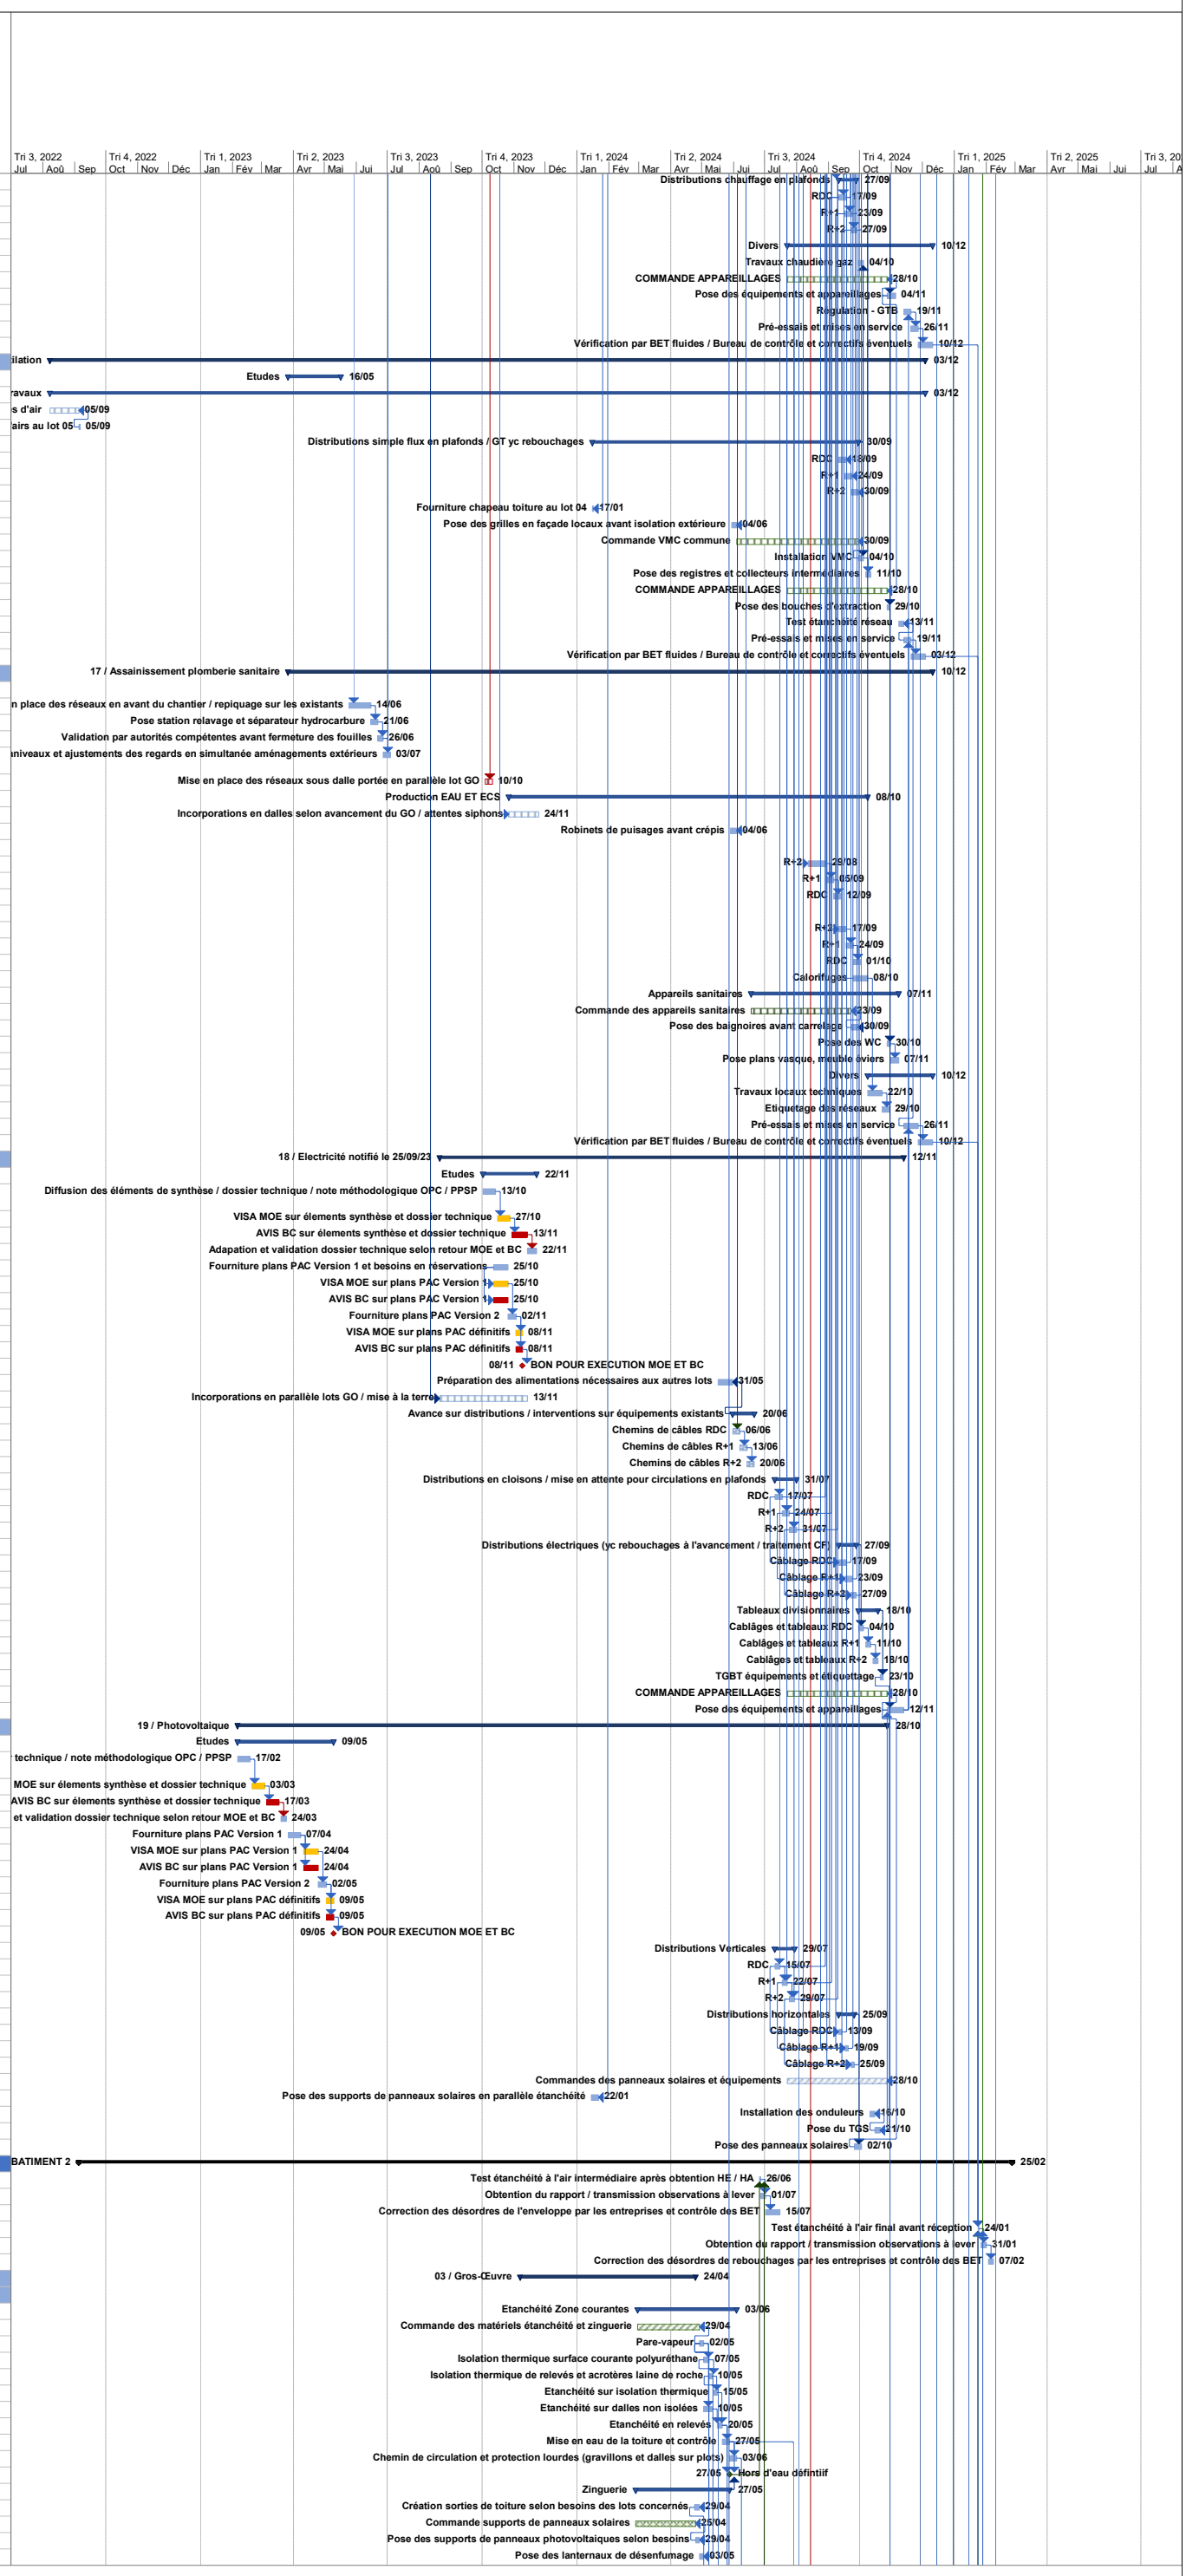

PLANNING EXE 2 mis à jour reconsultation lot chauffage

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE 18 LOGEMENTS A SOUFFELWEYERSHEIM

SEDES

N°	Activités	Durée	Début	Fin
652	Pose des couvertines selon détail D04	1 sem.	Mar 21/05/24	Lun 27/05/24
653	Percement EP et trop plein	3 jours	Ven 03/05/24	Mer 08/05/24
654	05 / Menuiseries extérieures	145 jours	Ven 22/03/24	Mer 30/10/24
655	Commandes et fabrications sur plans	8 sem.	Ven 22/03/24	Jeu 23/05/24
656	Hors D'air complet après pose des nouvelles menuiseries extérieures	0 jour	Mar 25/06/24	Mar 25/06/24
657	Pose des menuiseries extérieures PVC	24 jours	Jeu 23/05/24	Mar 25/06/24
658	RDC	8 jours	Jeu 23/05/24	Lun 03/06/24
659	R+1	8 jours	Mar 04/06/24	Jeu 13/06/24
660	R+2	8 jours	Ven 14/06/24	Mar 25/06/24
661	Caissons de VR et BSO en aluminium	9 jours	Mer 26/06/24	Lun 08/07/24
662	RDC	3 jours	Mer 26/06/24	Ven 28/06/24
663	R+1	3 jours	Lun 01/07/24	Mer 03/07/24
664	R+2	3 jours	Jeu 04/07/24	Lun 08/07/24
665	Prise de mesures des BSO et tablettes de fenêtres	1 jour	Lun 05/08/24	Lun 05/08/24
666	Fabrication des BSO et tablettes de fenêtres	3 sem.	Mar 06/08/24	Ven 06/09/24
667	Pose des BSO et tablettes	9 jours	Lun 09/09/24	Jeu 19/09/24
668	RDC	3 jours	Lun 09/09/24	Mer 11/09/24
669	R+1	3 jours	Jeu 12/09/24	Lun 16/09/24
670	R+2	3 jours	Mar 17/09/24	Jeu 19/09/24
671	Pose des ouvrants de désenfumages	3 jours	Ven 14/06/24	Mar 18/06/24
672	Pose des portes vitrées extérieures neuves	10 jours	Jeu 23/05/24	Mer 05/06/24
673	Pose des tablettes extérieures	2 sem.	Mar 04/06/24	Lun 17/06/24
674	Pose des tablettes intérieures	5 jours	Mer 23/10/24	Mer 30/10/24
675	Equipements et réglages	10 jours	Lun 09/09/24	Ven 20/09/24
676	Câblages en simultanée électricien	2 sem.	Lun 09/09/24	Ven 20/09/24
677	06 / Serrurerie	491 jours	Lun 05/09/22	Lun 23/09/24
678	Portes intérieures métalliques	168 jours	Lun 15/01/24	Lun 23/09/24
679	Fourniture des huisseries à bancher au lot 03	2 sem.	Lun 15/01/24	Lun 29/01/24
680	Commande des portes à peindre	8 sem.	Mer 10/07/24	Mar 17/09/24
681	Pose des portes à peindre	5 jours	Mar 17/09/24	Lun 23/09/24
682	Garde-corps acrotères et mains courante terrasse et escalier	100 jours	Ven 08/03/24	Mer 31/07/24
683	Commande platines et éléments de réhause acrotères	6 sem.	Ven 08/03/24	Mar 23/04/24
684	Mise en place de platines avant étanchéité	4 jours	Mar 23/04/24	Lun 29/04/24
685	Pose des garde-corps en toiture	3 jours	Lun 29/07/24	Mer 31/07/24
686	Pose des échelles à crinoline	2 jours	Jeu 01/08/24	Ven 02/08/24
687	Pose des grilles de ventilations	2 jours	Jeu 08/08/24	Lun 12/08/24
688	Pose des boîtes aux lettres	2 jours	Lun 05/09/22	Mar 06/09/22
689	07 / Isolation et peinture extérieure	156 jours	Lun 29/01/24	Jeu 19/09/24
690	Isolation extérieure / peinture / crépis	156 jours	Lun 29/01/24	Jeu 19/09/24
691	Isolation thermique verticale enterrée des soubassements selon détail D09	5 jours	Lun 29/01/24	Lun 05/02/24
692	Préparation des supports	2 sem.	Mer 26/06/24	Mar 09/07/24
693	Profils de départs	3 jours	Mer 10/07/24	Ven 12/07/24
694	Isolation extérieure (yc ébrasements fenêtres)	3 sem.	Lun 15/07/24	Ven 02/08/24
695	Profilés en périphérie des menuiseries avec tôle en aluminium	1 sem.	Lun 05/08/24	Ven 09/08/24
696	Crépis / Peinture / lasures extérieurs	2 sem.	Lun 12/08/24	Jeu 05/09/24
697	Sèchage crépis	2 sem.	Ven 06/09/24	Jeu 19/09/24
698	Veture isolée	104 jours	Ven 12/04/24	Jeu 19/09/24
699	Validation des échantillons vétures et crépis	10 jours	Ven 12/04/24	Ven 26/04/24
700	Commande matériel véture	12 sem.	Ven 26/04/24	Mar 23/07/24
701	Structure ossature bardage composite	1 sem.	Mar 23/07/24	Mar 30/07/24
702	Isolation derrière véture	1 sem.	Mar 30/07/24	Mar 06/08/24
703	Jonction entre crépis et bardage terre cuite selon détail D05	4 jours	Mar 06/08/24	Lun 12/08/24
704	Pose véture après crépis yc profils de finition	2 sem.	Ven 06/09/24	Jeu 19/09/24
705	08 / Echafaudages	115 jours	Jeu 04/04/24	Jeu 26/09/24
706	Installation des échafaudages de protections collectives	1 sem.	Jeu 04/04/24	Mer 10/04/24
707	Contrôle des échafaudage par CSPS	1 jour	Jeu 11/04/24	Jeu 11/04/24
708	Démontage des échafaudages de protections collectives	5 jours	Ven 20/09/24	Jeu 26/09/24
709	09/ Platrerie - faux plafonds	62 jours	Lun 01/07/24	Lun 07/10/24
710	Pose des ossatures métalliques cloisons / gaines techniques	15 jours	Lun 01/07/24	Ven 19/07/24
711	RDC	5 jours	Lun 01/07/24	Ven 05/07/24
712	R+1	5 jours	Lun 08/07/24	Ven 12/07/24
713	R+2	5 jours	Lun 15/07/24	Ven 19/07/24
714	Placo première peaux et doublages cloisons existantes	15 jours	Lun 22/07/24	Ven 09/08/24
715	RDC	5 jours	Lun 22/07/24	Ven 26/07/24
716	R+1	5 jours	Lun 29/07/24	Ven 02/08/24
717	R+2	5 jours	Lun 05/08/24	Ven 09/08/24
718	Fermeture des cloisons après passage fluides	13 jours	Jeu 29/08/24	Lun 16/09/24
719	RDC	5 jours	Jeu 29/08/24	Mer 04/09/24
720	R+1	5 jours	Mer 04/09/24	Mar 10/09/24
721	R+2	5 jours	Mar 10/09/24	Lun 16/09/24
722	Fermetures des gaines techniques après passages fluides (YC enduits)	10 jours	Mar 17/09/24	Lun 30/09/24
723	RDC	2 jours	Mar 17/09/24	Mer 18/09/24
724	R+1	2 jours	Lun 23/09/24	Mar 24/09/24
725	R+2	2 jours	Ven 27/09/24	Lun 30/09/24
726	Fermetures des passages fluides cloisons après réception des bon à boucher	12 jours	Jeu 29/08/24	Ven 13/09/24
727	RDC	4 jours	Jeu 29/08/24	Mar 03/09/24
728	R+1	4 jours	Mer 04/09/24	Lun 09/09/24
729	R+2	4 jours	Mar 10/09/24	Ven 13/09/24
730	Pose de structures de plafonds fixes et soffites pour gaines techniques	12 jours	Jeu 05/09/24	Ven 20/09/24
731	RDC	4 jours	Jeu 05/09/24	Mar 10/09/24
732	R+1	4 jours	Mer 11/09/24	Lun 16/09/24
733	R+2	4 jours	Mar 17/09/24	Ven 20/09/24
734	Fermeture plafonds fixes et soffites (YC ENDUITS)	11 jours	Mer 18/09/24	Mer 02/10/24
735	RDC	3 jours	Mer 18/09/24	Ven 20/09/24
736	R+1	3 jours	Mar 24/09/24	Jeu 26/09/24
737	R+2	3 jours	Lun 30/09/24	Mer 02/10/24
738	Enduits de finitions avant peintures / Réception des supports avec lots concernés	11 jours	Lun 23/09/24	Lun 07/10/24
739	RDC	3 jours	Lun 23/09/24	Mer 25/09/24
740	R+1	3 jours	Ven 27/09/24	Mar 01/10/24
741	R+2	3 jours	Jeu 03/10/24	Lun 07/10/24
742	10 / Menuiseries intérieures bois	109 jours	Jeu 05/09/24	Jeu 20/02/25
743	Fabrication des portes	8 sem.	Jeu 05/09/24	Jeu 31/10/24
744	Bloc-portes intérieurs des logements à peindre	9 jours	Jeu 31/10/24	Ven 15/11/24
745	RDC	3 jours	Jeu 31/10/24	Mer 06/11/24
746	R+1	3 jours	Mer 06/11/24	Mar 12/11/24
747	R+2	3 jours	Mar 12/11/24	Ven 15/11/24
748	Bloc-portes palières	13 jours	Jeu 14/11/24	Lun 02/12/24
749	RDC	3 jours	Jeu 14/11/24	Lun 18/11/24
750	R+1	3 jours	Jeu 21/11/24	Lun 25/11/24
751	R+2	2 jours	Ven 29/11/24	Lun 02/12/24
752	Trappes d'accès au GT	2 jours	Mar 01/10/24	Mer 02/10/24
753	Signalétique de sécurité	28 jours	Ven 06/12/24	Mar 28/01/25
754	Proposition du plans d'évacuation et plan d'intervention pompiers	5 jours	Ven 06/12/24	Ven 13/12/24
755	Validation par les autorités compétentes	20 jours	Ven 13/12/24	Ven 24/01/25
756	Pose de la signalétique	3 jours	Ven 24/01/25	Mar 28/01/25
757	Mise en forme de l'organigramme des clés	3 jours	Jeu 19/12/24	Mar 07/01/25
758	Validation organigramme par la MOA / MOE	2 sem.	Mar 07/01/25	Mar 21/01/25
759	Pose des serrures	3 jours	Mar 21/01/25	Ven 24/01/25
760	Pose de séparatifs cave	3 jours	Mar 21/01/25	Ven 24/01/25
761	Remise des clés	0 jour	Jeu 20/02/25	Jeu 20/02/25
762	11 / Carrelage	40 jours	Mer 02/10/24	Jeu 28/11/24
763	Préparation des supports et Ragréages fibrés	20 jours	Mer 02/10/24	Mar 29/10/24
764	RDC	2 jours	Lun 28/10/24	Mar 29/10/24
765	R+1	2 jours	Mer 02/10/24	Jeu 03/10/24
766	R+2	2 jours	Mar 08/10/24	Mer 09/10/24
767	Pose des sols carrelages	15 jours	Mer 30/10/24	Jeu 21/11/24
768	RDC	5 jours	Mer 30/10/24	Mer 06/11/24
769	R+1	5 jours	Jeu 07/11/24	Jeu 14/11/24
770	R+2	5 jours	Ven 15/11/24	Jeu 21/11/24
771	Pose des plinthes et faïences	15 jours	Jeu 07/11/24	Jeu 28/11/24
772	RDC	5 jours	Jeu 07/11/24	Jeu 14/11/24
773	R+1	5 jours	Ven 15/11/24	Jeu 21/11/24
774	R+2	5 jours	Ven 22/11/24	Jeu 28/11/24
775	12 / Sols souples	20 jours	Jeu 14/11/24	Mer 11/12/24
776	Préparation des supports et enduits de lissage / ragréages	13 jours	Jeu 14/11/24	Lun 02/12/24
777	RDC	2 jours	Jeu 14/11/24	Ven 15/11/24
778	R+1	2 jours	Jeu 21/11/24	Ven 22/11/24
779	R+2	2 jours	Ven 29/11/24	Lun 02/12/24
780	Pose des sols PVC	15 jours	Lun 18/11/24	Ven 06/12/24
781	RDC	4 jours	Lun 18/11/24	Jeu 21/11/24
782	R+1	4 jours	Lun 25/11/24	Jeu 28/11/24
783	R+2	4 jours	Mar 03/12/24	Ven 06/12/24
784	Pose des plinthes	14 jours	Ven 22/11/24	Mer 11/12/24
785	RDC	3 jours	Ven 22/11/24	Mar 26/11/24
786	R+1	3 jours	Ven 29/11/24	Mar 03/12/24
787	R+2	3 jours	Lun 09/12/24	Mer 11/12/24
788	13 / Peintures intérieures	96 jours	Mar 24/09/24	Jeu 20/02/25
789	Peinture des ouvrages en bois avant pose par menuisiers (trappe GT / tablettes)	1 sem.	Mar 24/09/24	Mar 01/10/24
790	Peinture des ouvrages en bois avant pose par menuisiers (portes)	1 sem.	Jeu 24/10/24	Jeu 31/10/24
791	Réceptions et Préparation des supports	16 jours	Mer 30/10/24	Ven 22/11/24
792	RDC	5 jours	Mer 30/10/24	Mer 06/11/24
793	R+1	5 jours	Jeu 07/11/24	Jeu 14/11/24
794	R+2	6 jours	Ven 15/11/24	Ven 22/11/24
795	Mise en peinture des murs et plafonds	15 jours	Jeu 07/11/24	Jeu 28/11/24
796	RDC	4 jours	Jeu 07/11/24	Mer 13/11/24
797	R+1	4 jours	Ven 15/11/24	Mer 20/11/24

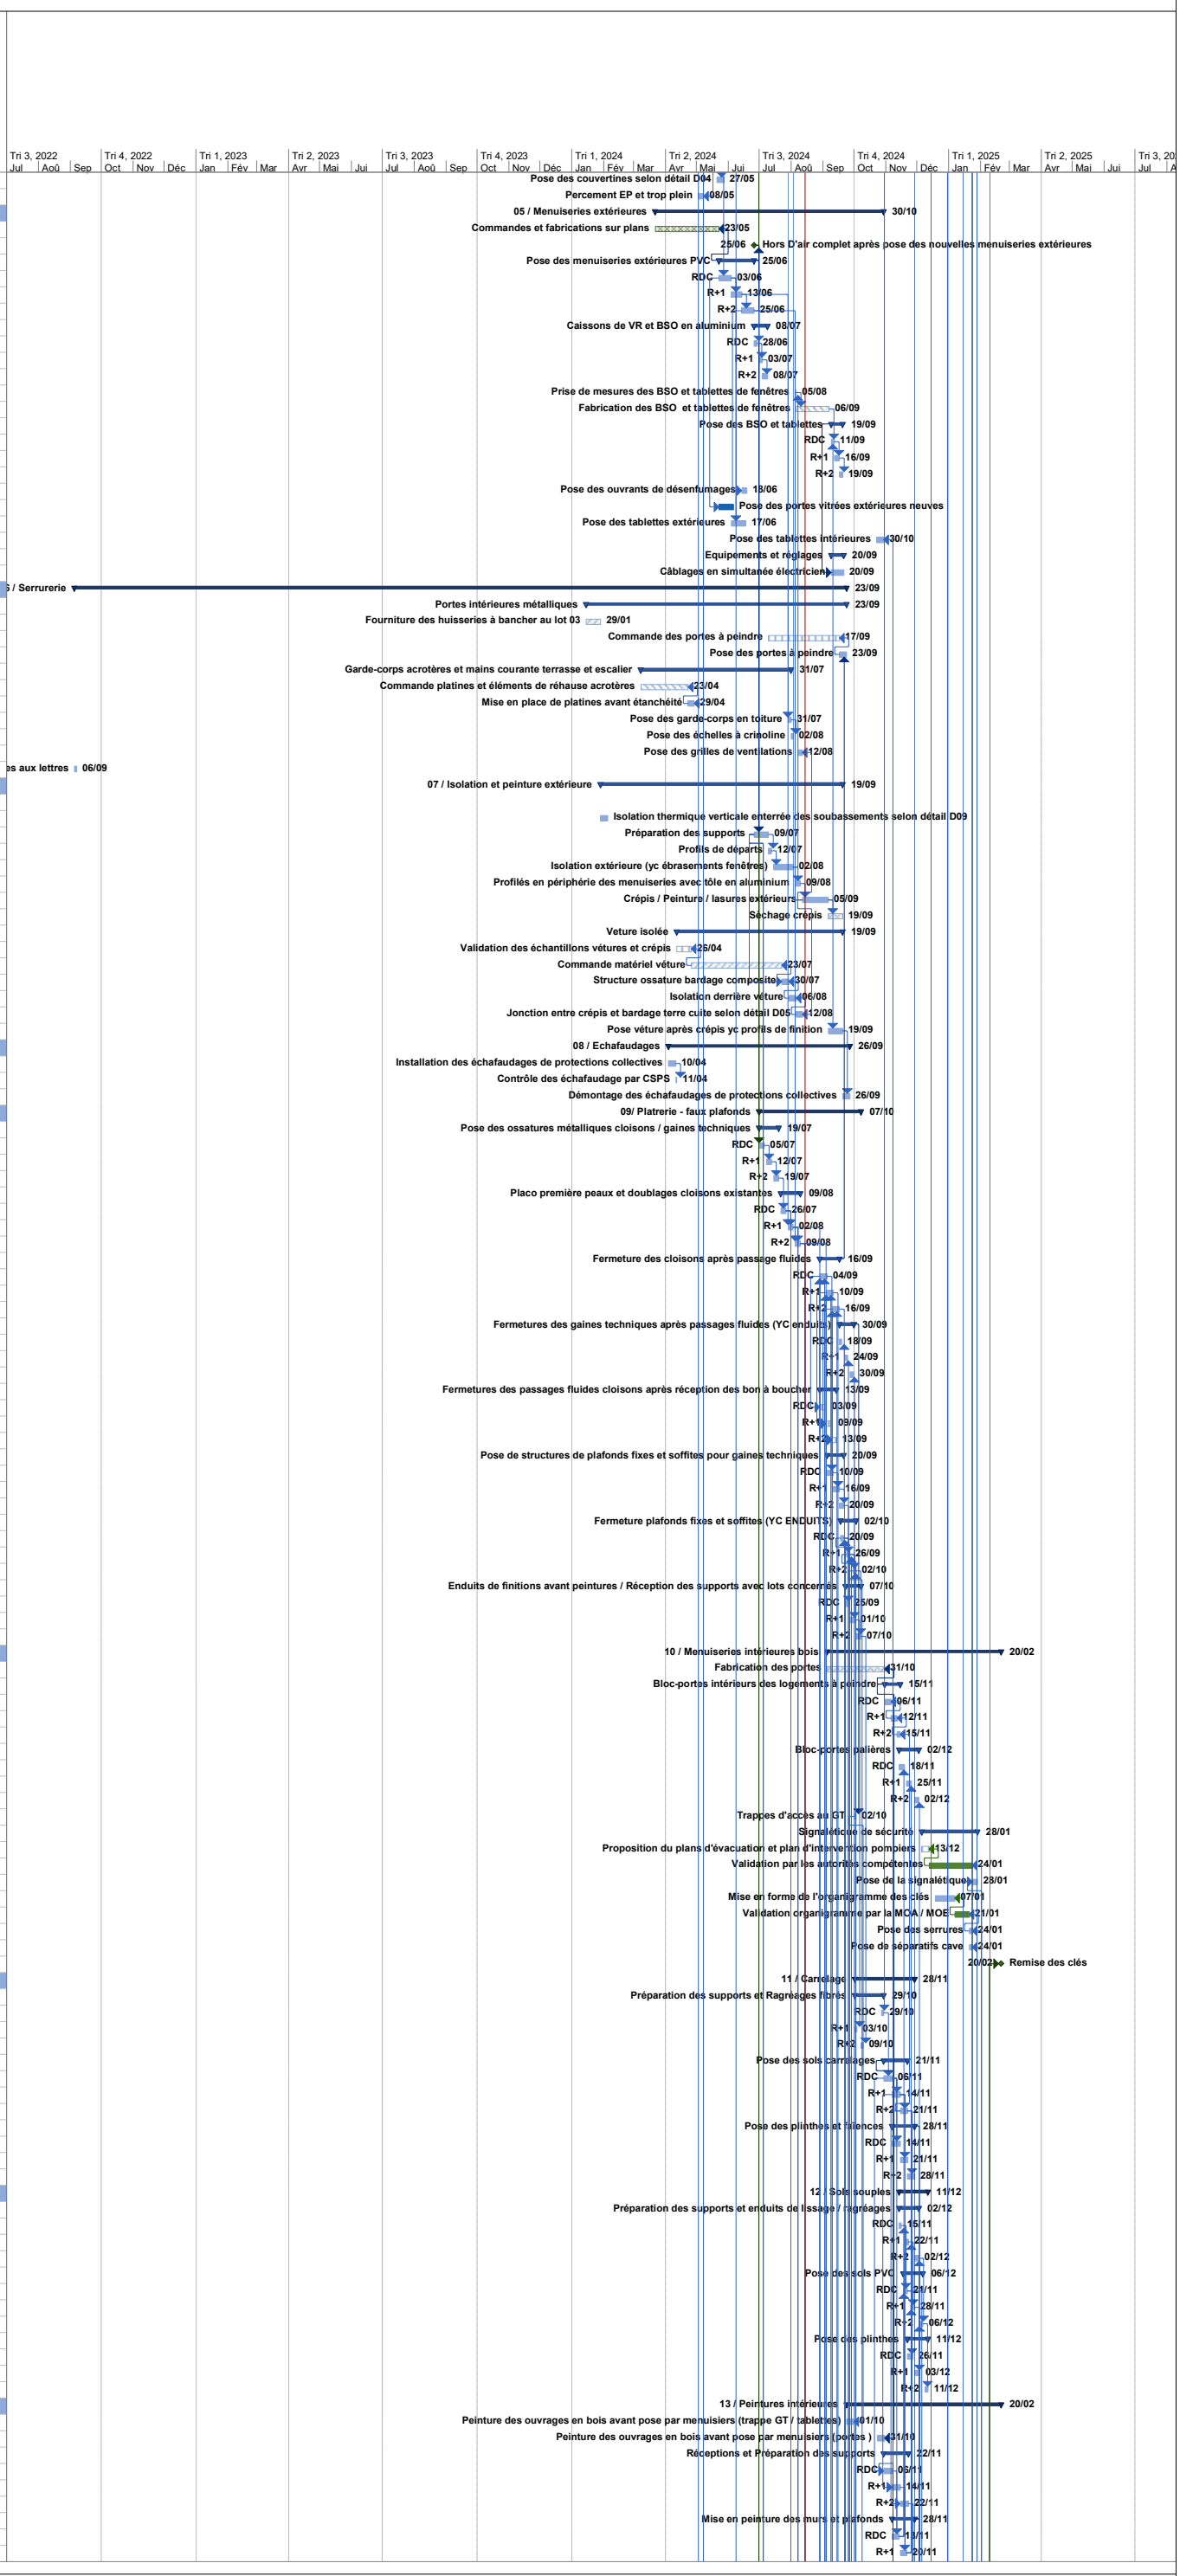

PLANNING EXE 2 mis à jour reconsultation lot chauffage

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE 18 LOGEMENTS A SOUFFELWEYERSHEIM

SEDES
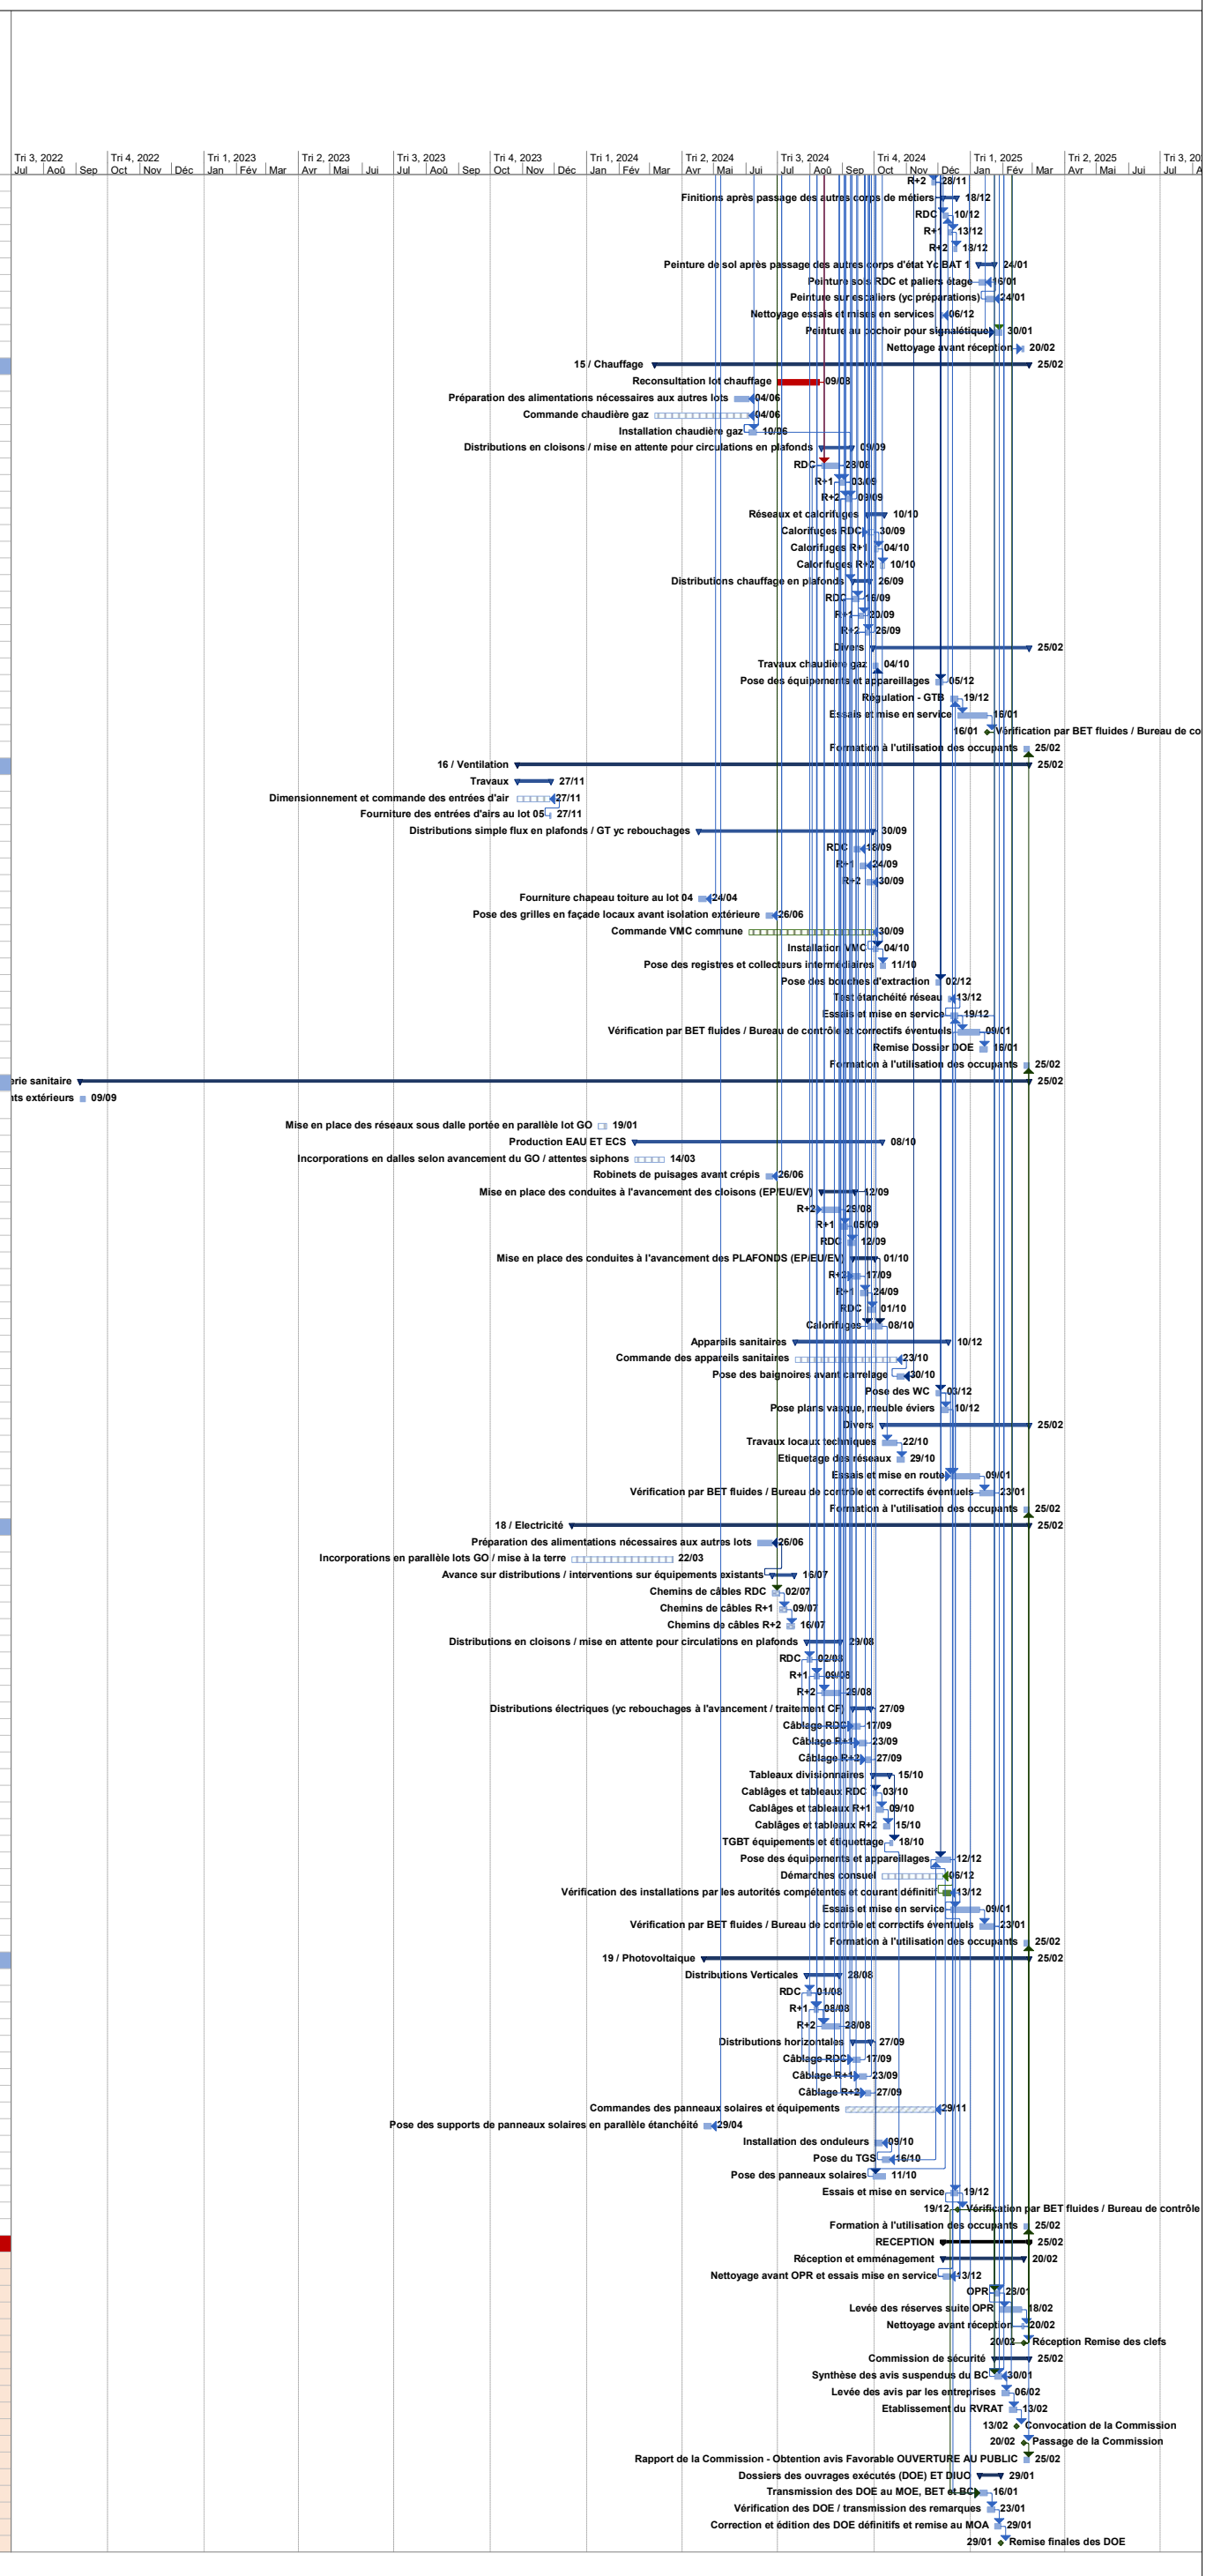
N°	Activités	Durée	Début	Fin
798	R+2	4 jours	Lun 25/11/24	Jeu 28/11/24
799	**Finitions après passage des autres corps de métiers**	**9 jours**	**Ven 06/12/24**	**Mer 18/12/24**
800	RDC	3 jours	Ven 06/12/24	Mar 10/12/24
801	R+1	3 jours	Mer 11/12/24	Ven 13/12/24
802	R+2	3 jours	Lun 16/12/24	Mer 18/12/24
803	**Peinture de sol après passage des autres corps d'état Yc BAT 1**	**11 jours**	**Jeu 09/01/25**	**Ven 24/01/25**
804	Peinture sols RDC et paliers étage	5 jours	Jeu 09/01/25	Jeu 16/01/25
805	Peinture sur escaliers (yc préparations)	6 jours	Jeu 16/01/25	Ven 24/01/25
806	Nettoyage essais et mises en services	3 jours	Mar 03/12/24	Ven 06/12/24
807	Peinture au pochoir pour signalétique	1 sem.	Ven 24/01/25	Jeu 30/01/25
808	Nettoyage avant réception	2 jours	Mer 19/02/25	Jeu 20/02/25
809	**15 / Chauffage**	**230 jours**	**Mer 06/03/24**	**Mar 25/02/25**
810	Reconsultation lot chauffage	6 sem.	Lun 01/07/24	Ven 09/08/24
811	Préparation des alimentations nécessaires aux autres lots	2 sem.	Mar 21/05/24	Mar 04/06/24
812	Commande chaudière gaz	12 sem.	Mer 06/03/24	Mar 04/06/24
813	Installation chaudière gaz	1 sem.	Mar 04/06/24	Lun 10/06/24
814	**Distributions en cloisons / mise en attente pour circulations en plafonds**	**12 jours**	**Lun 12/08/24**	**Lun 09/09/24**
815	RDC	4 jours	Lun 12/08/24	Mer 28/08/24
816	R+1	4 jours	Jeu 29/08/24	Mar 03/09/24
817	R+2	4 jours	Mer 04/09/24	Lun 09/09/24
818	**Réseaux et calorifuges**	**12 jours**	**Mer 25/09/24**	**Jeu 10/10/24**
819	Calorifuges RDC	4 jours	Mer 25/09/24	Lun 30/09/24
820	Calorifuges R+1	4 jours	Mar 01/10/24	Ven 04/10/24
821	Calorifuges R+2	4 jours	Lun 07/10/24	Jeu 10/10/24
822	**Distributions chauffage en plafonds**	**12 jours**	**Mer 11/09/24**	**Jeu 26/09/24**
823	RDC	4 jours	Mer 11/09/24	Lun 16/09/24
824	R+1	4 jours	Mar 17/09/24	Ven 20/09/24
825	R+2	4 jours	Lun 23/09/24	Jeu 26/09/24
826	**Divers**	**95 jours**	**Lun 30/09/24**	**Mar 25/02/25**
827	Travaux chaudière gaz	1 sem.	Lun 30/09/24	Ven 04/10/24
828	Pose des équipements et appareillages	1 sem.	Ven 29/11/24	Jeu 05/12/24
829	Régulation - GTB	5 jours	Ven 13/12/24	Jeu 19/12/24
830	Essais et mise en service	2 sem.	Ven 20/12/24	Jeu 16/01/25
831	Vérification par BET fluides / Bureau de contrôle et correctifs éventuels	0 sem.	Jeu 16/01/25	Jeu 16/01/25
832	Formation à l'utilisation des occupants	3 jours	Ven 21/02/25	Mar 25/02/25
833	**16 / Ventilation**	**312 jours**	**Ven 27/10/23**	**Mar 25/02/25**
834	**Travaux**	**21 jours**	**Ven 27/10/23**	**Lun 27/11/23**
835	Dimensionnement et commande des entrées d'air	4 sem.	Ven 27/10/23	Lun 27/11/23
836	Fourniture des entrées d'airs au lot 05	1 jour	Lun 27/11/23	Lun 27/11/23
837	**Distributions simple flux en plafonds / GT yc rebouchages**	**107 jours**	**Mer 17/04/24**	**Lun 30/09/24**
838	RDC	4 jours	Jeu 12/09/24	Mer 18/09/24
839	R+1	0,8 sem.	Mer 18/09/24	Mar 24/09/24
840	R+2	0,8 sem.	Mar 24/09/24	Lun 30/09/24
841	Fourniture chapeau toiture au lot 04	5 jours	Mer 17/04/24	Mer 24/04/24
842	Pose des grilles en façade locaux avant isolation extérieure	4 jours	Jeu 20/06/24	Mer 26/06/24
843	Commande VMC commune	15 sem.	Mar 04/06/24	Lun 30/09/24
844	Installation VMC	1 sem.	Lun 30/09/24	Ven 04/10/24
845	Pose des registres et collecteurs intermédiaires	5 jours	Lun 07/10/24	Ven 11/10/24
846	Pose des bouches d'extraction	2 jours	Ven 29/11/24	Lun 02/12/24
847	Test étanchéité réseau	2 jours	Mer 11/12/24	Ven 13/12/24
848	Essais et mise en service	1 sem.	Ven 13/12/24	Jeu 19/12/24
849	Vérification par BET fluides / Bureau de contrôle et correctifs éventuels	1 sem.	Ven 20/12/24	Jeu 09/01/25
850	Remise Dossier DOE	1 sem.	Ven 10/01/25	Jeu 16/01/25
851	Formation à l'utilisation des occupants	3 jours	Ven 21/02/25	Mar 25/02/25
852	**17 / Assainissement plomberie sanitaire**	**590 jours**	**Lun 05/09/22**	**Mar 25/02/25**
853	Mise en place des caniveaux et ajustements des regards en simultanée aménagements extérieurs	5 jours	Lun 05/09/22	Ven 09/09/22
854	Mise en place des réseaux sous dalle portée en parallèle lot GO	6 jours	Ven 12/01/24	Ven 19/01/24
855	**Production EAU ET ECS**	**155 jours**	**Ven 16/02/24**	**Mar 08/10/24**
856	Incorporations en dalles selon avancement du GO / attentes siphons	1 mois	Ven 16/02/24	Jeu 14/03/24
857	Robinets de puisages avant crépis	4 jours	Jeu 20/06/24	Mer 26/06/24
858	Mise en place des conduites à l'avancement des cloisons (EP/EU/EV)	15 jours	Lun 12/08/24	Jeu 12/09/24
859	R+2	5 jours	Lun 12/08/24	Jeu 29/08/24
860	R+1	5 jours	Ven 30/08/24	Jeu 05/09/24
861	RDC	5 jours	Ven 06/09/24	Jeu 12/09/24
862	Mise en place des conduites à l'avancement des PLAFONDS (EP/EU/EV)	15 jours	Mer 11/09/24	Mar 01/10/24
863	R+2	5 jours	Mer 11/09/24	Mar 17/09/24
864	R+1	5 jours	Mer 18/09/24	Mar 24/09/24
865	RDC	5 jours	Mer 25/09/24	Mar 01/10/24
866	Calorifuges	2 sem.	Mer 25/09/24	Mar 08/10/24
867	**Appareils sanitaires**	**93 jours**	**Jeu 18/07/24**	**Mar 10/12/24**
868	Commande des appareils sanitaires	12 sem.	Jeu 18/07/24	Mer 23/10/24
869	Pose des baignoires avant carrelage	5 jours	Mer 23/10/24	Mer 30/10/24
870	Pose des WC	3 jours	Ven 29/11/24	Mar 03/12/24
871	Pose plans vasque, meuble éviers	5 jours	Mer 04/12/24	Mar 10/12/24
872	**Divers**	**88 jours**	**Mer 09/10/24**	**Mar 25/02/25**
873	Travaux locaux techniques	2 sem.	Mer 09/10/24	Mar 22/10/24
874	Etiquetage des réseaux	5 jours	Mer 23/10/24	Mar 29/10/24
875	Essais et mise en route	2 sem.	Ven 13/12/24	Jeu 09/01/25
876	Vérification par BET fluides / Bureau de contrôle et correctifs éventuels	2 sem.	Ven 10/01/25	Jeu 23/01/25
877	Formation à l'utilisation des occupants	3 jours	Ven 21/02/25	Mar 25/02/25
878	**18 / Electricité**	**277 jours**	**Lun 18/12/23**	**Mar 25/02/25**
879	Préparation des alimentations nécessaires aux autres lots	2 sem.	Mer 12/06/24	Mer 26/06/24
880	Incorporations en parallèle lots GO / mise à la terre	3 mois	Lun 18/12/23	Ven 22/03/24
881	**Avance sur distributions / interventions sur équipements existants**	**15 jours**	**Mer 26/06/24**	**Mar 16/07/24**
882	Chemins de câbles RDC	5 jours	Mer 26/06/24	Mar 02/07/24
883	Chemins de câbles R+1	5 jours	Mer 03/07/24	Mar 09/07/24
884	Chemins de câbles R+2	5 jours	Mer 10/07/24	Mar 16/07/24
885	**Distributions en cloisons / mise en attente pour circulations en plafonds**	**15 jours**	**Lun 29/07/24**	**Jeu 29/08/24**
886	RDC	5 jours	Lun 29/07/24	Ven 02/08/24
887	R+1	5 jours	Lun 05/08/24	Ven 09/08/24
888	R+2	5 jours	Lun 12/08/24	Jeu 29/08/24
889	**Distributions électriques (yc rebouchages à l'avancement / traitement CF)**	**13 jours**	**Mer 11/09/24**	**Ven 27/09/24**
890	Câblage RDC	5 jours	Mer 11/09/24	Mar 17/09/24
891	Câblage R+1	5 jours	Mar 17/09/24	Lun 23/09/24
892	Câblage R+2	5 jours	Lun 23/09/24	Ven 27/09/24
893	**Tableaux divisionnaires**	**12 jours**	**Lun 30/09/24**	**Mar 15/10/24**
894	Cablâges et tableaux RDC	4 jours	Lun 30/09/24	Jeu 03/10/24
895	Cablâges et tableaux R+1	4 jours	Ven 04/10/24	Mer 09/10/24
896	Cablâges et tableaux R+2	4 jours	Jeu 10/10/24	Mar 15/10/24
897	TGBT équipements et étiquettage	3 jours	Mer 16/10/24	Ven 18/10/24
898	Pose des équipements et appareillages	2 sem.	Ven 29/11/24	Jeu 12/12/24
899	Démarches consuel	8 sem.	Mer 09/10/24	Ven 06/12/24
900	Vérification des installations par les autorités compétentes et courant définitif	1 sem.	Ven 06/12/24	Ven 13/12/24
901	Essais et mise en service	2 sem.	Ven 13/12/24	Jeu 09/01/25
902	Vérification par BET fluides / Bureau de contrôle et correctifs éventuels	2 sem.	Ven 10/01/25	Jeu 23/01/25
903	Formation à l'utilisation des occupants	3 jours	Ven 21/02/25	Mar 25/02/25
904	**19 / Photovoltaique**	**199 jours**	**Lun 22/04/24**	**Mar 25/02/25**
905	**Distributions Verticales**	**14 jours**	**Lun 29/07/24**	**Mer 28/08/24**
906	RDC	4 jours	Lun 29/07/24	Jeu 01/08/24
907	R+1	4 jours	Lun 05/08/24	Jeu 08/08/24
908	R+2	4 jours	Lun 12/08/24	Mer 28/08/24
909	**Distributions horizontales**	**13 jours**	**Mer 11/09/24**	**Ven 27/09/24**
910	Câblage RDC	5 jours	Mer 11/09/24	Mar 17/09/24
911	Câblage R+1	5 jours	Mar 17/09/24	Lun 23/09/24
912	Câblage R+2	5 jours	Lun 23/09/24	Ven 27/09/24
913	Commandes des panneaux solaires et équipements	12 sem.	Mer 04/09/24	Ven 29/11/24
914	Pose des supports de panneaux solaires en parallèle étanchéité	1 sem.	Lun 22/04/24	Lun 29/04/24
915	Installation des onduleurs	5 jours	Mer 02/10/24	Mer 09/10/24
916	Pose du TGS	5 jours	Mer 09/10/24	Mer 16/10/24
917	Pose des panneaux solaires	2 sem.	Lun 30/09/24	Ven 11/10/24
918	Essais et mise en service	1 sem.	Ven 13/12/24	Jeu 19/12/24
919	Vérification par BET fluides / Bureau de contrôle et correctifs éventuels	0 sem.	Jeu 19/12/24	Jeu 19/12/24
920	Formation à l'utilisation des occupants	3 jours	Ven 21/02/25	Mar 25/02/25
921	**RECEPTION**	**48 jours**	**Ven 06/12/24**	**Mar 25/02/25**
922	**Réception et emménagement**	**45 jours**	**Ven 06/12/24**	**Jeu 20/02/25**
923	Nettoyage avant OPR et essais mise en service	5 jours	Ven 06/12/24	Ven 13/12/24
924	OPR	3 jours	Ven 24/01/25	Mar 28/01/25
925	Levée des réserves suite OPR	3 sem.	Mer 29/01/25	Mar 18/02/25
926	Nettoyage avant réception	2 jours	Mer 19/02/25	Jeu 20/02/25
927	Réception Remise des clefs	0 jour	Jeu 20/02/25	Jeu 20/02/25
928	**Commission de sécurité**	**23 jours**	**Ven 24/01/25**	**Mar 25/02/25**
929	Synthèse des avis suspendus du BC	1 sem.	Ven 24/01/25	Jeu 30/01/25
930	Levée des avis par les entreprises	1 sem.	Ven 31/01/25	Jeu 06/02/25
931	Etablissement du RVRAT	1 sem.	Ven 07/02/25	Jeu 13/02/25
932	Convocation de la Commission	0 jour	Jeu 13/02/25	Jeu 13/02/25
933	Passage de la Commission	0 jour	Jeu 20/02/25	Jeu 20/02/25
934	Rapport de la Commission - Obtention avis Favorable OUVERTURE AU PUBLIC	3 jours	Ven 21/02/25	Mar 25/02/25
935	**Dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ET DIUO**	**14 jours**	**Ven 10/01/25**	**Mer 29/01/25**
936	Transmission des DOE au MOE, BET et BC	1 sem.	Ven 10/01/25	Jeu 16/01/25
937	Vérification des DOE / transmission des remarques	1 sem.	Ven 17/01/25	Jeu 23/01/25
938	Correction et édition des DOE définitifs et remise au MOA	4 jours	Ven 24/01/25	Mer 29/01/25
939	Remise finales des DOE	0 jour	Mer 29/01/25	Mer 29/01/25
